



ДОГОВОР

№ МТ-...64... / 2018 г.

Днес, 9.02...2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

и

„Електростроежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 1, тел: 038/665261, факс: 038/624725; e-mail: elstro@abv.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:126066624, ИН по ДДС: BG 126066624; представлявано от **Калин Кирилов Проданов** – Изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол № МТ – 5/24.01.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строителни и монтажни работи – реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0 в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 82/2017 – ОПИС, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу заплащане **строително–монтажни работи - реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0 в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №2 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работния проект, техническата спецификация и указанията на Възложителя, техническото предложение на Изпълнителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.



1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е **59 912,85 лева** (петдесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева и осемдесет и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2 неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 54 466,23 лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 5 446,62 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: PRCBBSGF

IBAN: BG77 PRCB 2301 0423 8019

БАНКА: „Прокредит Банк“ АД – клон Хасково

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е 2 995,64 (две хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки) лева, което е 5% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да прекрати договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

а) Сертификати за качество (оригинал) за доставените от него изделия или материал (когато е приложимо)

б) Сертификат за произход на влаганите материали

в) Оригинални гаранционни карти или друг документ, удостоверяващ гаранционния срок за всеки вид стока, с включени всички гаранционни условия (когато е приложимо)

г) Фактура

д) Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

4.3. Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

4.4. За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-север“, с. Ковачево.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до **50 (петдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен календарен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 5 /пет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, т.5 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.



9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;

11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатиране недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по седалището на възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

13.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки, а също и спиране на действието му в следните хипотези:

13.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

13.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп.. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

13.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп.. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)


13.3. Сроктът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

13.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13.5. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

13.6. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

13.7. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.



13.8. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАЛИН ПРОДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



Гертана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инженеринг“

Иван Николаев
Старши юристконсулт „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Тотева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „Реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0“
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката (или на позицията)

СМР: „Реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0“

Място на изпълнение: Р-к „Трояново-север“

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Фани Василева по част Архитектурна и Конструктивна и д-р инж. Димитър Цонев по част Електро .

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема Реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0

- по следните части:

- Работен проект - част „АС и Конструктивна“, 369/9;
- Работен проект - част "Архитектурна", 369/10;
- Работен проект - част " Електро ", 369/11;
- Работен проект - част ПУСО, 369/13;
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 369/14
- Работен проект - част „ЛБЗ“, 369/13;

3. Категория на строежа: изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“ (42.99 КИД-2008).

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение

и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на вложените материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
 - Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
 - Фактура
8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
 - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
 - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
 - Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България
 - Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
 - Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
 - Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
 - Закон за техническите изисквания към продуктите
 - Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
 - Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 т.5 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 2 календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инвеститорски контрол“

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлнев

Р-л отдел „Инвестиции“

**„ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ“ АД, гр. ХАСКОВО****Хасково – 6300 ул. „Патриарх Евтимий“ №1****038/665261 факс 038/624725****elstro@abv.bg****ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

От: „Електростроежи“ АД, ЕИК 126066624, Седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий, № 1 тел.: 038/665261, факс: 038/624725, e-mail: elstro@abv.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Строителни и монтажни работи – реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0 в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 82/2017 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на : 59 912,85 лв.

Словом: Петдесет и девет хиляди деветстотин и дванадесет лева и осемдесет и пет стотинки.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме раз мествали редове, променяли и пропускали позиции. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая. При формиране на сумата на непредвидените разходи (10%) същите са начислени върху общата стойност. Сбора на общата стойност и непредвидените разходи (10%) формира сметната стойност.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- В) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
- Г) Попълнена методика за определяне на цената и условията за плащане

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 18.12.2017

Подпис: _____

Калин Проданов

Изпълнителен директор



„Електростроежи“ АД, гр. Хасково

„Строителни и монтажни работи – реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0 в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 82/2017 – ОПнс

Реконструкция на мобилна пробовземача система 109-29658-0 -рудник "Трояново-Север"

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	К:во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
		1.ЧАСТ АС						
1	*121400729	ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ /ВЕРТИКАЛНА СТЬЛБА, ПАРАПЕТИ/	кг	1 468,00	1,10	1 614,80		
2	*080400083	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ РАМКИ С ПОЛИКАРБОНАТ	м2	40,00	15,62	624,80		
3	*000100190	ПРЕВОЗ ЖЕЛЕЗАРСКИ ИЗДЕЛИЯ - СТАРИ НА ЗКМ	тона	1,50	22,93	34,40		
4	8101105122	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ-РЪЧНО <<01-01-028>>	м3	2,20	23,98	52,76		
5	8101113100	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ РЪЧНО <<01-01-059>>	м3	1,20	5,10	6,12		
6	8101114111	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО <<01-01-060>>	м3	1,20	2,20	2,64		
7	8101403210	НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР <<01-04-032>>	м3	1,00	5,53	5,53		
8	*121400004	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3	1,00	9,60	9,60		
9	8101409111	РАЗРИВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР НА ДЕПО <<01-04-063>>	м3	1,00	1,75	1,75		
10	8102050100	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ <<02-05-001>>	м2	7,00	17,71	123,97	12,80	89,60
11	8102061050	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ АЗ /В500В/ <<02-06-005>>	кг	10,00	1,95	19,50	1,17	11,70
12	8102067010	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ №8 КАРЕ 15/15СМ <<02-06-030>>	кг	59,00	1,95	115,05	1,17	69,03
13	8102071050	БЕТОН В20 КЛАС С16/20 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ ВЪВ ФУНДАМЕНТИ <<02-07-019>>	м3	2,00	118,85	237,70	108,00	216,00
14	*121400247	ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	2,00	30,00	60,00		
15	*121400550	ПРЕВОЗ НА БЕТОН С РЪЧНИ КОЛИЧКИ	м3	2,00	27,85	55,70		
16	*000100200	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ	тона	9,30	1 820,37	16 929,44	1 480,00	13 764,00
17	8311111732	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ <<12-01-0391>>	тона	9,30	450,00	4 185,00		
18	8311111641	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ГЕТЕРОСИ ТИП SP330-34/38-3 <<12-01-038>>	тона	0,66	10 900,00	7 194,00	9 000,00	5 940,00
19	*000100034	НАПРАВА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ	м	50,00	45,43	2 271,50	30,85	1 542,50


№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
20	*000100089	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПЛАНКИ ПОД СТОМАНЕН ФУНДАМЕНТ	кг	500,00	2,45	1 225,00	1,20	600,00
21	*000100207	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	11,21	22,93	257,05		
22	*645300628	БОЛТОВЕ M16x60 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	308,00	0,65	200,20	0,65	200,20
23	*645300963	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M16 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 5.6/	бр.	308,00	0,25	77,00	0,25	77,00
24	*645300964	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16 ISO 7090	бр.	616,00	0,15	92,40	0,15	92,40
25	*645300507	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M16 КЛИНОВИДНА i=8%	бр.	28,00	0,10	2,80	0,10	2,80
26	*645301246	БОЛТОВЕ M20x60 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4014	бр.	16,00	1,80	28,80	1,80	28,80
27	*645300328	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 КЛАС 8.8 БДС EN ISO 4032	бр.	16,00	0,45	7,20	0,45	7,20
28	*645300329	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.	32,00	0,22	7,04	0,22	7,04
29	*645300445	БОЛТОВЕ M12x50 КЛАС 5.6 БДС EN ISO 4014	бр.	132,00	0,45	59,40	0,45	59,40
30	*000100059	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12КЛАС 5 БДС EN ISO 4032	бр.	132,00	0,20	26,40	0,20	26,40
31	*645300319	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090	бр.	132,00	0,12	15,84	0,12	15,84
32	*121400062	НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ"	бр.	2,00	2,85	5,70		
33	*645300959	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ ТИП "ХИЛТИ" HAS E M16 С НІТ-RE 500	бр.	2,00	3,80	7,60	3,80	7,60
34	*000100205	ОБШИВКА ПО ПОКРИВ С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 55x1С цвят по RAL 5010	м2	34,00	20,86	709,24	7,00	238,00
35	8311211310	Н-ВА ОБШИВКА С ТРАПЕЦОВИДНА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЛТ 40x0,8 ПО ФАСАДИ С цвят по <<12-01-056>>	м2	141,50	13,15	1 860,73		
36	8102101300	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА С РВС ПОКРИТИЕ ПО ПОКРИВ И ФАСАДА-цвят по 'RAL 5010 <<02-10-003>>	м2	20,00	13,15	263,00	13,15	263,00
37	8102101200	ОБШИВКА С ГЛАДКА ЛАМАРИНА С РВС ПОКРИТИЕ ОКОЛО ОТВОРИ-ВРАТИ ПО ФАСАДА <<02-10-002>>	м2	7,50	13,15	98,63	13,15	98,63
38	*209000152	ОБШИВКА С ПЛОСКОСТ ОТ ПОЛИКАРБОНАТ 10ММ ,цвят "кристал" ПО ФАСАДА+ ОБКОВ 'ОТ	м2	17,00	20,84	354,28	20,84	354,28
39	*645300931	Д-КА НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА ОТ ЕДИН ПЛАСТ ЛАМАРИНА С Р-РИ 80/200	бр.	1,00	325,00	325,00	325,00	325,00
40	*645300967	Д-КА НА МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА ОТ ЕДИН ПЛАСТ ЛАМАРИНА С Р-РИ 100/200	бр.	2,00	405,35	810,70	405,35	810,70
41	*645300968	Д-КА НА МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА ОТ ЕДИН ПЛАСТ ЛАМАРИНА С Р-РИ 200/200	бр.	1,00	850,00	850,00	850,00	850,00

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
42	*000100114	МОНТАЖ МЕТАЛНИ ВРАТИ	кг	480,00	0,45	216,00		
43	*121400641	ПЯСКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	269,00	6,28	1 689,32		
44	*000100041	ПОЧИСТВАНЕ И РЕМОНТ НА АКЗ ПО СЪЩЕСТВ. МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ+ГРУНДИРАНЕ	м2	50,00	10,57	528,50	2,10	105,00
45	8102162090	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-015>>	м2	269,00	3,29	885,01	2,10	564,90
46	8102162120	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ <<02-16-018>>	м2	269,00	5,46	1 468,74	4,00	1 076,00
47	8102162130	ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ /с боя с дебелина, осигуряваща R120 < <<02-16-019>>	м2	139,50	9,56	1 333,62	7,10	990,45
48	8418380000	ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ /с боя с дебелина, осигуряваща R60	м2	171,00	9,56	1 634,76	7,10	1 214,10
49	8418410000	ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ /с боя с дебелина, осигуряваща R45	м2	31,50	9,56	301,14	7,10	223,65
		всичко по част АС				48 885,34		29 871,22
		II. ЧАСТ ЕЛ						
		II.1 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	8430947000	ДЕМОНТАЖ НА МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ С ВИСОЧИНА	бр.	4,00	10,50	42,00		
2	*861000380	ДЕМОНТАЖ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ОТ ЖЕЛЪЗНА К-ЦИЯ	м	8,00	1,75	14,00		
3	*861000381	ДЕМОНТАЖ ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ОТ ГОТОВ ИЗКОП	м	8,00	1,75	14,00		
		мълниеващитна инсталация-демонтажни работи						
		II.2 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	*861000365	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф8ММ	м	32,00	1,85	59,20	1,10	35,20
2	*861000364	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПРОВОДНИК ТИП ALMgSi 0.5 Ф11ММ	м	45,00	1,85	83,25	1,10	49,50
3	*861000370	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МУЛТИКЛЕМА ОТ НЕРЪЖД. СТОМАНА Ф8/Ф8ММ	бр.	6,00	4,00	24,00	2,00	12,00
4	*861000366	Д-КА И М-Ж КЛИПС НЕРЪЖД. Ф8ММ В КОМПЛЕКТ С УПЛЪТНИТЕЛНА ОСНОВА И ВИНТ	бр.	18,00	0,77	13,86	0,50	9,00
5	*861000384	Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ (УНИВЕРСАЛЕН) ЗА ЦЕНТРАЛЕН МОНТАЖ	бр.	4,00	0,79	3,16	0,50	2,00
6	*861000367	Д-КА И М-Ж ДЪРЖАЧ ЗА СТЕНА Ф8ММ, КОМПЛ. С ВИНТ 8ММ	бр.	45,00	0,79	35,55	0,50	22,50
7	*861000383	Д-КА И М-Ж НА СЪЕДИНИТЕЛНА КЛЕМА (ФАЛЦОВА) ВЪЖЕ-СТОМ. КОНСТР	бр.	8,00	9,19	73,52	4,80	38,40
8	*861000386	Д-КА И М-Ж НА СВЪРЗВАЩА ГАРНИТУРА (ОЗЕМКА) ВЪЖЕ-СТОМ. КОНСТР.	бр.	4,00	15,80	63,20	9,70	38,80

№	Шифър	Наименование	марка	К-во	цена	стойност	ц.м-ли	ст.м-ли
17	*861000356	ИЗМЕРВАНЕ ПЪЛНОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНТУРА ЗА ЗАЩ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.-8ч.ч./	ч.ч	8.00	18.16	145.24		
18	*861000307	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ТОЧКА ОТ ЗАЩИТНОТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ /16р.4ч.ч./	ч.ч	16.00	18.17	290.67		
всичко по част ЕЛ						1,083.68		292.75
		ВСИЧКО:				49,969.01		
		ПЕЧАЛБА 9 %:				4,497.21		
		ОБЩА СТОЙНОСТ:				54,466.23		
		НЕПРЕДВИДЕНИ 10%:				5,446.62		
		СМЕТНА СТОЙНОСТ:				59,912.85		

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Калин Проданов

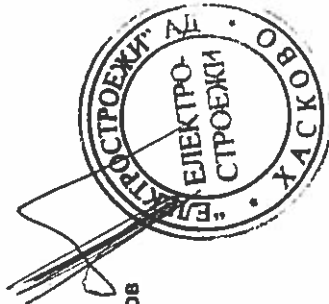

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР


№	Видове механизация инструменти/	/специални	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв	Деп. разходи, %	Стойност, лв.
1	Пробивна машина		10	10,00	35	350,00
2	Комбиниран багер		1	350,00	35	1 225,00
3	Самосвал		1	300,00	35	1 050,00
4	Булдозер		1	350,00	35	1 225,00
5	Заварачен апарат		4	2,00	35	28,00
6	Автобетонсмесител		1	550,00	35	1 925,00
7	Песокоструйка		4	220,00	35	3 080,00

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Калин Проданов

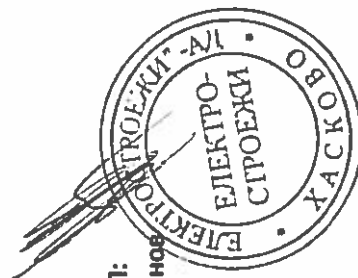

СПЕЦИФИКАЦИЯ


на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-на	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст фракция обекта, лв	Фирма производител
1	ПОЦИНКОВАНИ ГЕТЕРОСИ ТИП SP330-34/38-3	тона	0,66	9 000,00	8	4 752,00	"Лихтитер България" ООД
2	БЕТОН В20 КЛАС C16/20 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ	м3	2,00	108,00	8	172,80	Бетонов възел
3	МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА ОТ ЕДИН ПЛАСТ ЛАМАРИНА С Р-РИ 80/200	бр.	1,00	325,00	8	260,00	Собствена изработка
4	МЕТАЛНА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА ОТ ЕДИН ПЛАСТ ЛАМАРИНА С Р-РИ 100/200	бр.	2,00	405,35	8	648,56	Собствена изработка
5	МЕТАЛНА ДВУКРИЛА ПЛЪТНА ВРАТА ОТ ЕДИН ПЛАСТ ЛАМАРИНА С Р-РИ 200/200	бр.	1,00	850,00	8	680,00	Собствена изработка
6	ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ /с боя с дебелина, осигуряваща R120	м2	139,50	7,10	8	792,36	"Оргакхим" Русе
7	ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ /с боя с дебелина, осигуряваща R60	м2	171,00	7,10	8	971,28	"Оргакхим" Русе
8	ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ /с боя с дебелина, осигуряваща R45	м2	31,50	7,10	8	178,92	"Оргакхим" Русе
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Калин Проданов

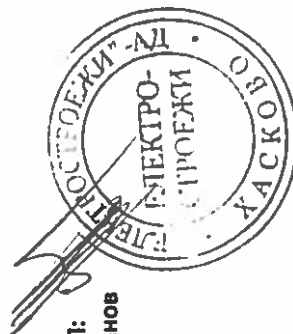

**МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/**

за изпълнение на СМР на обект:

Реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0 -рудник "Трояново-Север"

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 90 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 35 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 8 %

2.4. Печалба: 9 %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Калин Проданов





ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „Електростроежи“ АД, ЕИК/БУЛСТАТ: 126066624, седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий, № 1, тел.: 038/665261, факс: 038/624725, e-mail: elstro@abv.bg
Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Строителни и монтажни работи – реконструкция на мобилна пробовземача система 109-29658-0 в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево“ – реф. № 82/2017 – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно работния проект, техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. При изпълнение на СМР се задължаваме да спазваме всички инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи посочени в т.7 от техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 50 (петдесет) календарни дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15. С офертата си представяме линеен календарен линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционни срокове и условия:

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 (пет) години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, т.5 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционния срок на доставените от нас материали съответства на гаранционния срок, предлаган от производителя, удостоверен с подходящ документ при доставка (например гаранционна карта).

Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.



При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта и представяме декларация за извършен оглед на обекта – по образец на възложителя.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекутивна документация. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение № 1 – Линеен календарен график за изпълнение на работите.

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Приложение №3 – Декларация за извършен оглед на обекта

~~Приложение №4 – Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника~~

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 18.12.2017

Подпис: _____

Калин Проданов

Изпълнителен директор



Реконструкция на мобилна пробовземача система 109-29658-0 -рудник "Трояново-Север"

ЛИНЕЕН ГРАФИК

№	Наименование	10	20	30	40	50
I.	I. ЧАСТ АС	→				
II.	II. ЧАСТ ЕЛ					
II.1.	II.1 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ - ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	→				
II.2.	II.2 МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ - МОНТАЖНИ РАБОТИ					→

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Калин Проданов

