



## ДОГОВОР

№ МТ - 410 /2018 г.

Днес, 28. 11. 2018 г. в град Раднево, между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

*Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя ще се извършва от: отдел „Инвестиции” в управлението на дружеството*

*Контрол по изпълнението на договора ще се изпълнява от: рудник „Трояново - 3” с. „Медникарово”*

И

**„СТРЕЗА” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Стамболийски” №134, ет.3 тел:02/4484117, e-mail: [streza\\_eood@abv.bg](mailto:streza_eood@abv.bg) ; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:131223059, ИН по ДДС: 131223059, представлявано от **Янко Стоянов Шумков** – управител,

на основание Решение №МТ-04-3589/04.10.2018г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Саниране ремонтно хале участък „Ремонт ролки“ рудник „Трояново – 3“ - реф.№47/2018г., се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане извършване на СМР: Саниране ремонтно хале участък „Ремонт ролки“ рудник „Трояново – 3“ - съгласно техническата спецификация на възложителя и техническата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

1.2. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)).



## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

**2.1.** Сметната стойност на Договора е **47 871,27 лева** (четиридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и един лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 2, неразделна част от договора.

**2.2.** Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката, съгласно обема работа и графика за изпълнение на дейностите, в това число:

**а) обща стойност: 45 591,69 лева без ДДС**

**б) възможни непредвидени разходи (5% от общата стойност): 2 279,58 лв. без ДДС.**

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

**2.3.** Цената е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите по настоящия договор.

**2.4.** Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

**2.5.** Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

**2.6.** Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**2.7.** Условия на плащане: Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва:

**а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на предаване на фактурата от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец.** Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра.

**б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15) на база Сметка за изплащанена строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект ( по образец на Възложителя) .**

**2.8.** Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на Работите за всяка конкретна поръчка ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, съгласно Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава максималната цена на договора посочена в т.2.1. от него.



2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG36BPBI79401079817601

БАНКА: Юробанк България АД

2.10. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

### **3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е до 2 (два) месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в Линеен график за изпълнение на работите – Приложение №3 към настоящия договор.

3.2. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

3.3. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

3.4. Мястото на изпълнение по смисъла на договора е: Рудник „Трояново - 3” с. „Медникарово“

### **4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

#### **4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

4.1.1 Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.1.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.



#### **4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

4.2.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

4.2.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

#### **4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

4.3.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

4.3.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

#### **4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

4.4.1 Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

4.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

### **5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

#### **5.1. Изпълнителят гарантира качеството:**

- на изпълнените видове работи – **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

**5.2.** Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

**5.3.** На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършените дейности. Срокът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 (пет) дни от датата на констатирането им.

**5.4.** В срок от 2 дни от получаване на възражението от Възложителя, Изпълнителят е длъжен да се яви за съставяне на констативен протокол.

**5.5.** Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

**5.6.** Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.

### **6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНАТА РАБОТА**

**6.1.** Приемането по количество и качество, както и стойностният обем на извършената работа ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №2.

**6.2.** Окончателното предаване и приемане на извършената работа, предмет на този договор, става с Констативен акт обр. 15.



6.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки ден закъснение върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може да прекрати договора.

7.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

7.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

## **8. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

9.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .



- 9.1.2.** При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.1.3.** Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)
- 9.2.** Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.
- 9.3.** Срокът на изпълнение на конкретната поръчка автоматично се удължава със срока на спиране на договора.
- 9.4.** За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**10.1.** Настоящият договор се прекратява:

**10.1.1.** С изтичане на срока по т.3.1. или до изчерпване на стойността по т.2.1 в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

**10.1.2.** По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

**10.1.3.** При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

**10.1.4.** При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

**10.1.5.** Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

**10.2.** Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

**10.2.1.** забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

**10.2.2.** не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатираните недостатъци;

**10.2.3.** не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

**10.2.4.** използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

**10.2.5.** бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

**10.3.** Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 -седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

**10.4.** При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети,



които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 393,56лв. - 5% от обща стойност на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

## **13. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

13.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **14. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

14.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

## **16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ**

16.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

16.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

16.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

16.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

16.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

16.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.





Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**АНДОН АНДОНОВ**

**Изпълнителен директор**

Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев  
Ръководител отдел „Технически“

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Маркетинг и продажби“

Снежана Варелова  
Ст. юрисконсулт, Пр. служба


Изготвил:  
Виолета Куртева  
Експерт търговия, от. „Търговски“

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**ЯНКО ШУМКОВ**

**заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ**

**"Санитарен ремонтно хале участък "Ремонт ролки"-рудник Трояново - 3"  
(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката СМР: Ремонт на ремонтно хале  
участък "Ремонт ролки"- санитарен**

**Място на изпълнение: рудник Трояново - 3**

**2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Фани Василева по част Архитектурна.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**3. Категория на строежа: изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”(43.29, 43.32 КИД - 2008)**

**4. Изисквания към изпълнението на строителството** Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

**6. Качеството на материалите за строителния процес -** При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите,

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

**7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (5%). **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.** Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
  - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
  - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
- Фактура

#### **8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 1з—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

#### **9. Гаранционен срок, условия на гаранцията**

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверява с подходящ документ (например: гаранционна карта).

#### 10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 2 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### 11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Анна Мащикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

СЪГЛАСУВАЛИ:

Живко Желев

Р-л звено ИК

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

"Санирание ремонтно хале участък "Ремонт ролки"-рудник Трояново - 3"

№	Наименование на материала	М-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	От-от франко обекта, лв.	Фирма-производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Списък**  
**на използваните машини и ценоразпис на машиносмените**  
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"Санирание ремонтно хале участък "Ремонт ролки"-рудник Трояново - 3"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стоимост, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**"Санитарен ремонтно хале участък "Ремонт ролки"-рудник Трояново - 3"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : ..... %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: ..... %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: ..... %

2.4. Печалба:..... %

2.5. ....

2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



### 5.1. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Саниране ремонтно хале участък „Ремонт ролки“ рудник „Трояново – 3“ - реф. № 47/2018 г.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО  
ул. „Георги Димитров“ - № 13

ОТ:

„СТРЕЗА“ ЕООД  
гр. София 1309, бул. „Александър Стамболийски“ № 134, ет. 3

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Предлаганата от нас сметна стойност за изпълнение на поръчката е както следва:

**47 871,27 лв.**

/словом: четиридесет и седем хиляди осемстотин седемдесет и един лева и 27 ст./

Предложената сметна стойност може да бъде установена в ценовата таблица (количествено-стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовото предложение.


Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертираната цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера.

**Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.**

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.



Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя), придружена с анализни цени за всеки вид СМР.
2. Приложение № 2 - Спецификации и единични цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);
3. Приложение № 3 - Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);
4. Приложение № 4 – Методика за определяне на цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива - при необходимост (по образец на възложителя).

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG 36 BPBI 7940 1079 8176 01

BIC: BPBIBGSF

Банка: „Юробанк България“ АД – град/клон/офис: гр. София, ФЦ „Цар Освободител“;

Титуляр на сметката: «Стреза» ЕООД

Дата: 23.07.2018 г.

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Янко Шумков  
(име и фамилия)



**Приложение №1**  
**към Договор №МТ...../2018г.**  
**"Саниране ремонтно хале участък "Ремонт ролки"-рудник Трояново - 3"**

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

№	Шифър	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
1	2	3	4	5	6	7
1		Демонтаж на стоманени прозорци с единично остъквяване	м <sup>2</sup>	252,00		
2		Демонтаж алуминиеви врати	бр.	3,00		
3		Ръчно натоварване, превоз и разтоварване н астроителни отпадъци с количка на 50 м	м <sup>3</sup>	13,00		
4		Натоварване отпадъци на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	13,00		
5		Превоз на отпадъци със самосвал на 10 км	м <sup>3</sup>	13,00		
6		Доставка на алуминиеви прозорци - стъклопакет с прекъснат термомост	м <sup>2</sup>	252,00		
7		Монтаж на алуминиеви прозорци	м <sup>2</sup>	252,00		
8		Доставка , направа и монтаж на индустриална стоманена секционна врата 36/400 с вградена малка врата, вкл. и ел.захранване	бр.	2,00		
9		Доставка на алуминиева врата - плътна	м <sup>2</sup>	5,00		
10		Монтаж на алуминиева врата - плътна	м <sup>2</sup>	5,00		
11		Тръбно подпорно скеле - подвижно	м <sup>3</sup>	50,00		
		ОБЩА СТОЙНОСТ				
		ПЕЧАЛБА ..... %				
		ОБЩА СТОЙНОСТ				
		НЕПРЕДВИДЕНИ 5 %				
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващият инвеститорски контрол на обекта:  
инж.Фани Василева

## „Санитарен ремонтно хале участък "Ремонт ролки"- рудник Трояново - 3"

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Шифър	Наименование	мярка	к-во	цена	стойност
1	2	3	4	5	6	7
1	CEK 14.024	Демонтаж на стоманени прозорци с единично остъкляване	м <sup>2</sup>	252.00	7.08	1,784.16
2	CEK 14.023	Демонтаж алуминиеви врати	бр.	3.00	7.08	21.24
3	8101115101	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци с количка на 50 м	м <sup>3</sup>	13.00	20.95	272.35
4	CEK 01.323	Натоварване отпадъци на транспорт с багер	м <sup>3</sup>	13.00	3.08	40.04
5	*001	Превоз на отпадъци със самосвал на 10 км	м <sup>3</sup>	13.00	43.20	561.60
6	*002	Доставка на алуминиеви прозорци - стъклопакет с прекъснат термомост	м <sup>2</sup>	252.00	104.16	26,248.32
7	CEK 14.024	Монтаж на алуминиеви прозорци	м <sup>2</sup>	252.00	23.64	5,957.28
8	*003	Доставка , направа и монтаж на индустриална стоманена секционна врата 36/400 с вградена малка врата, вкл. и ел. захранване	бр.	2.00	2,808.05	5,616.10
9	*004	Доставка на алуминиева врата - плътна	м <sup>2</sup>	5.00	91.84	459.20
10	CEK 14.024	Монтаж на алуминиева врата - плътна	м <sup>2</sup>	5.00	23.64	118.20
11	CEK 08.041	Тръбно подпорно скеле - подвижно	м <sup>3</sup>	50.00	7.37	368.50
		ОБЩА СТОЙНОСТ				41,446.99
		ПЕЧАЛБА 10 %				4,144.70
		ОБЩА СТОЙНОСТ				45,591.69
		НЕПРЕДВИДЕНИ 5 %				2,279.58
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				47,871.27

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Управител:.....  
/Янко Шумков/

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващият инвеститорски контрол на обекта:  
инж.Фани Василева

**"Санитарен ремонтно хале участък "Ремонт ролки"-рудник Трояново - 3"**

№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
<b>1</b>	<b>Демонтаж на стоманени прозорци с единично остъкляване</b>	<b>м<sup>2</sup></b>				
Анализ						
СЕК 14.024	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
% ОТ МОНТАЖ					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.	1.320	4.50	0.30	1.78
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.	1.320	4.50	0.30	1.78
			<b>0.79</b>			<b>3.56</b>
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	<b>12%</b>				<b>0.00</b>
	Доп.р.механизация (%)	<b>20%</b>				<b>0.00</b>
	Доп.р-ди труд (%)	<b>99%</b>				<b>3.52</b>
	<b>Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)</b>					<b>3.56</b>
	<b>Общо допълнителни р-ди</b>					<b>3.52</b>
	Начисления (%) (печалба)	<b>0%</b>				<b>0.00</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>7.08</b>



**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
2	Демонтаж алуминиеви врати	бр.				
Анализ						
СЕК 14.023	МАТЕРИАЛИ:					
% ОТ МОНТАЖ					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.	1.320	4.50	0.30	1.78
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.	1.320	4.50	0.30	1.78
			0.79			3.56
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				0.00
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				3.52
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					3.56
	Общо допълнителни р-ди					3.52
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					7.08



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

управител: 

№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
3	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване и асфалтни отпадъци с количка на 50 м	м3				
8101115101						
	МАТЕРИАЛИ:					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.	2.340	4.50	1.00	10.53
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
			2.34			10.53
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				0.00
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				10.42
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					10.53
	Общо допълнителни р-ди					10.42
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					20.95



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Управител: 



№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
4	Натоварване отпадъци на транспорт с багер	м3				
СЕК 01.323						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	БАГЕР 0.51	МСМ	0.00570	450.00	1.00	2.57
					1.00	0.00
						2.57
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК 10-2	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
	РАБОТНИК 10-1	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
			0.00			0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				0.00
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.51
	Доп.р-ди труд (%)	99%				0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					2.57
	Общо допълнителни р-ди					0.51
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					3.08



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



№ според номенклатура та (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
5	Превоз на отпадъци със самосвал на 10 км	м3				
*001						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
	САМОСВАЛ	КМ	20.00000	1.80	1.00	36.00
					1.00	0.00
						36.00
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
			0.00			0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				0.00
	Доп.р.механизация (%)	20%				7.20
	Доп.р-ди труд (%)	99%				0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					36.00
	Общо допълнителни р-ди					7.20
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					43.20

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Управител:

№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
6	Доставка на алуминиеви прозорци - стъклопакет с прекъснат термомост	м2				
*002						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	алуминиеви прозорци - стъклопакет с прекъснат термомост	М2	1.0000	93.00	1.00	93.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						93.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
			0.00			0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				11.16
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					93.00
	Общо допълнителни р-ди					11.16
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					104.16



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Управител: 

/Янко ПИЛИКОВ/

№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
7	Монтаж на алуминиеви прозорци	м2				
СЕК 14.024						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.	1.320	4.50	1.00	5.94
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.	1.320	4.50	1.00	5.94
			2.64			11.88
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				0.00
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				11.76
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					11.88
	Общо допълнителни р-ди					11.76
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					23.64



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

управител: 

№ според номенклатура та (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
8	Доставка , направа и монтаж на индустриална стоманена секционна врата 36/400 с вградена малка врата, вкл. и ел.захранване	бр.				
*003						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	индустриална стоманена секционна врата 36/400 с вградена малка врата, вкл. и ел.захранване	бр.	1.0000	2,501.57	1.00	2,501.57
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						2,501.57
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.	0.350	4.50	1.00	1.58
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.	0.350	4.50	1.00	1.58
			0.70			3.16
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				300.19
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				3.13
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					2,504.73
	Общо допълнителни р-ди					303.32
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					2,808.05



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Управител 

№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
9	Доставка на алуминиева врата - плътна	м <sup>2</sup>				
*004						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	алуминиева врата - плътна	м <sup>2</sup>	1.0000	82.00	1.00	82.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						82.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.		4.50	1.00	0.00
			0.00			0.00
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				9.84
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				0.00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					82.00
	Общо допълнителни р-ди					9.84
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					91.84



**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

управител: М. Д. Шумков


/Янко Шумков/



№ според номенклатур ата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
10	Монтаж на алуминиева врата - плътна	м2				
СЕК 14.024						
	МАТЕРИАЛИ:					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.	1.320	4.50	1.00	5.94
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.	1.320	4.50	1.00	5.94
			2.64			11.88
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				0.00
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				11.76
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					11.88
	Общо допълнителни р-ди					11.76
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					23.64

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

управител: \_\_\_\_\_



№ според номенклатура та (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
11	Тръбно подпорно скеле - подвижно	м3				
СЕК 08.041						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
	Тръбно подпорно скеле - подвижно	м3	1.0000	3.85	1.00	3.85
					1.00	0.00
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						3.85
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
					1.00	0.00
					1.00	0.00
						0.00
	<b>ТРУД :</b>					
	РАБОТНИК IIст.	ч.ч.	0.130	4.50	1.00	0.59
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.	0.210	4.50	1.00	0.95
			0.34			1.54
	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:</b>					
	Дост. скл. р-ди(%)	12%				0.46
	Доп.р.механизация (%)	20%				0.00
	Доп.р-ди труд (%)	99%				1.52
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					5.39
	Общо допълнителни р-ди					1.98
	Начисления (%) (печалба)	0%				0.00
	Обща цена :					7.37



Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Управител:

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,  
използвани за изпълнение на СМР на обект:

„Санирание ремонтно хале участък "Ремонт ролки" - рудник Трояново - 3"

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	Алуминий с прекъснат термомост	м2	252.00	82.50	12	23,284.80	"Влас" ООД
2	Стъклопакет	кв.м	231.00	21.50	12	5,562.48	"Джимл Дизайн" ООД
3	Ъглова сглобка	кг	20.00	1.50	12	33.60	Делвита ООД
4	Уплътнител МО 60	бр	7.00	18.30	12	143.47	Делвита ООД
5	Скрепителни елементи	бр	640.00	0.12	12	86.02	Делвита ООД
6	Термопанел	бр	1.00	18.40	12	20.61	Делвита ООД
7	Индустриална стоманена секционна врата	бр	2.00	1,860.00	12	4,166.40	Елит МС ООД
8	Акcesoари	кг	12.00	1.20	12	16.13	Делвита ООД
9							
10							

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ЯНКО БУЖУКОВ/



**СПИСК**  
**на използваните машини и ценоразпис на машиносмените**  
използвани за изпълнение на СМР на подобект:


„Санирание ремонтно хале участък "Ремонт ролки" - рудник Трояново - 3"

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	САМОСВАЛ	1.00	450.00	20.00	540.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение № 1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....  
/Янко Шумков/



## **МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/**

за изпълнение на СМР на обект:

**„Саниране ремонтно хале участък "Ремонт ролки"- рудник Трояново - 3"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда: 99 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 20 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 12%

2.4. Печалба: 10 %

2.5. ....

2.6. ....

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.


5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**



#### 4.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет „Саниране ремонтно хале участък „Ремонт ролки“ рудник „Трояново – 3“ - реф. №47/2018 г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

“СТРЕЗА” ЕООД – гр. София

район Възраждане, ул. Александър Стамболийски No 134, ет. 3

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Саниране ремонтно хале участък „Ремонт ролки“ рудник „Трояново – 3“ - реф. №47/2018г.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

##### 1. Изисквания към изпълнение на строителството:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба, която урежда изпълнението на строителния процес.

При изпълнение на СМР ще спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

По време на изпълнението на договора се задължаваме да извършваме почистване на площадката, както междинно, така и окончателно от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци за своя сметка, като това няма да се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

##### 2. Срок за изпълнение:

Ще изпълним поръчката в срок: до 2 (два) месеца от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Приложени Ви представяме **линеен график за изпълнение на работите** в предписаните от него гранични срокове за извършване на работите – Приложение №1.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

### 3. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

### 4. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- Декларации за съответствие на готовата продукция
- Сертификати за качество на вложените материали

*(Описват се всички документи)*

5. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.7 от техническата спецификация.

6. Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация *(по образец на Възложителя)*.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

### Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Линеен график за изпълнение работите – Приложение №1

2. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

*Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител*

3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

4. Декларация за оглед на обекта

5. Други документи и доказателства по преценка на участника

Дата: 23.07.2018

Подпис: \_\_\_\_\_



**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Янко Шумков  
*(име и фамилия)*

The bottom of the document features several handwritten signatures and official stamps. A circular stamp with the text "ЕООД" is visible. There are also several other circular and rectangular stamps, some of which are partially obscured by the signatures. The signatures are written in black ink and appear to be of various individuals.

# ЛИНЕЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

ID	№	Описание на СМР	Едцена	Количество	Продължителност /кал. дни/	Начало	Край
1		„Санитарен ремонтно хале участък Ремонт ролки“- рудник Трояново - 3"			56 days	3.9	28.10
2	I.	Подготвителни работи и откриване на строителната площадка	ч.ч.	15	1 day	3.9	3.9
3	1	Демонтаж на стоманени прозорци с единично остъкляване	м2	252,00	50 days	5.9	24.10
4	2	Демонтаж алуминиеви врати	бр.	3,00	2 days	25.10	26.10
5	3	Ръчно натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци с количка на 50 м	м3	13,00	30 days	25.9	24.10
6	4	Натоварване отпадъци на транспорт с багер	м3	13,00	30 days	25.9	24.10
7	5	Превоз на отпадъци със самосвал на 10 км	м3	13,00	30 days	25.9	24.10
8	6	Доставка на алуминиеви прозорци - стъклопакет с прекъснат термомост	м2	252,00	3 days	5.9	3.10
9	7	Монтаж на алуминиеви прозорци	м2	252,00	50 days	5.9	24.10
10	8	Доставка , направа и монтаж на индустриална стоманена секционна врата 36/400 с вградена малка врата, вкл. и ел. захранване	бр.	2,00	2 days	25.10	26.10
11	9	Доставка на алуминиева врата - плътна	м2	5,00	1 day	27.10	27.10
12	10	Монтаж на алуминиева врата - плътна	м2	5,00	1 day	27.10	27.10
13	11	Тръбно подпорно скеле - подвижно	м3	50,00	52 days	4.9	25.10
14	II.	Предаване на обекта с Констативен акт /обр.15/	ч.ч.	15	1 day	28.10	28.10

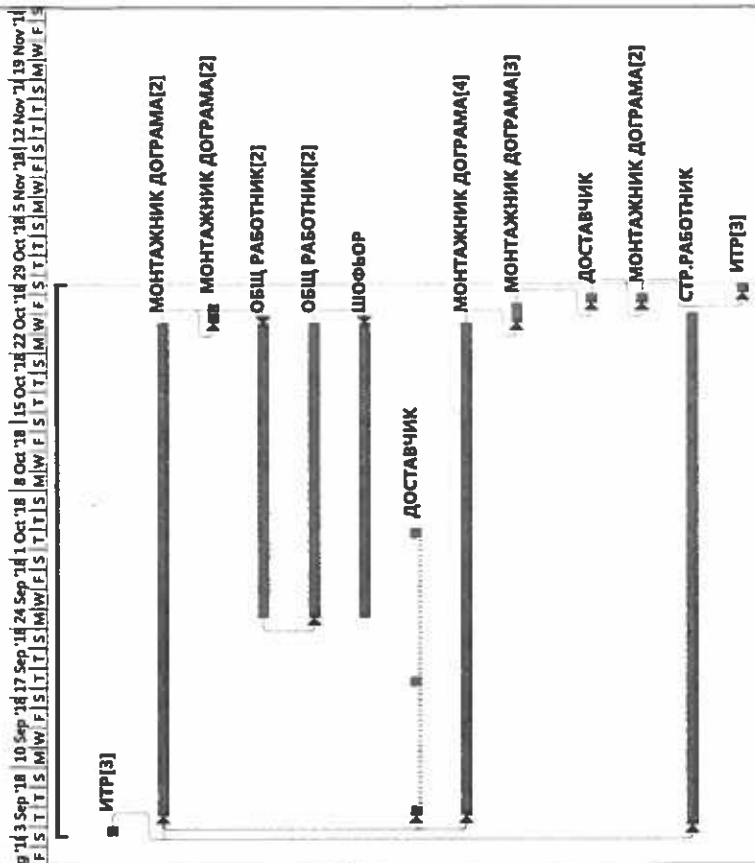

Землено по чл. 2 на ЗЗЛД

Упълномощен  
Гиньо Шумков

Handwritten signature and date 15.10.2019.
