



ДОГОВОР

№ 70-12...../2020 г.

Днес, 15.01.....2020 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции“, Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: рудник „Трояново – 1“, с.Трояново

И

„ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1700, р-н „Студентски“, ул. „21-ви век” № 30, офис 1.8, GSM:0888/730 100, e-mail: tes_kgroup@abv.bg ; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:204646910, ИН по ДДС: BG 204646910 ; представлявано от Теодор Евгениев Серафимов - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от,

на основание Решение №МТ-04-3231/18.11.2019г. на ИД и Протокол №27-2019/15.11.2019г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка” реф.№ 71/2019г. – публично състезание, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане строителни и монтажни работи по: Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка, съгласно техническата спецификация на възложителя – приложение



№1 и техническата оферта на изпълнителя – приложение №2, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за Пета група: отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” (код по КИД – 2008: 42.12; 42.13; 42.22; 43.1; 43.99).

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност (Цената) на Договора е в размер на **379 899,07 лв.** (триста седемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и седем стотинки), **без включен ДДС**, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност на СМР: **313 966,17 лева**, без включен ДДС

б) печалба **10%** от обща стойност на СМР: **31 396,62 лева**, без включен ДДС

в) възможни непредвидени разходи (**10%** от общата стойност (а+б)): **34 536,28лв.**, без включен ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евантуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG27UNCR70001523137913

БАНКА: Уникредит Булбанк АД

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Срокът за изпълнение на СМР е 24 (двадесет и четири) календарни месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е: между г. Разделна в западна и г. Любеново-предавателна в южна посока

3.3. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

3.4. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

3.5. Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя ексекүтивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – 10/десет/ години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

4.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

4.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

4.5. За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

4.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

4.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

4.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

5.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

6.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя

(<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

7.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.

9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Сроктът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

11. ПОДСЪДНОСТ

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 18 994,95 лв. - 5% от общата стойност (цената) на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на Раздел „9.” – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

13.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

13.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане”, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

13.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

13.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки, Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.



14.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

14.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

14.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОРЗД.

14.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

14.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породви правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – Изток“ ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инженеринг“

Мария Куманова
Юрисконсулт, Правна служба


Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия, отдел „Търговски“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ТЕОДОР СЕРАФИМОВ

УПРАВИТЕЛ



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ - „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА”**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА”**

Място на изпълнение: между г. Разделна в западна и г. Любеново-предавателна в южна посока.

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Динко Бинев по част АС и д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**Работен проект на тема: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА.
КОНТАКТНА МРЕЖА.**

- по следните части:

- Работен проект - част „Геодезия“, 0133/54 и 0133/57;
- Работен проект - част „Електро“, 0133/58;
- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 0133/55 и 0133/60;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 0133/53 и 0133/59;
- Работен проект - част ПУСО, 0133/56 и 0133/61
- Работен проект - част ПБЗ, 0133/62;

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент/и” навсякъде, където в документацията по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. При доставката на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

3. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горецитираните проекти. Изпълнението се извършва по изготвени чертежи, предоставени на Изпълнителя.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

4. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

5. Качеството на материалите за строителния процес - Изпълнителят е длъжен да представи документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

• Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

• Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

• При доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- ✓ Сертификати за качество на използваните материали;
- ✓ Декларация за съответствие на използваните материали;
- ✓ Фактура - оригинал.

• Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

• За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

• Изпълнението на предмета на процедурата е по **съгласуван график**, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

• Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя **екзекутивна документация на строежа**, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща

несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- Фактура

7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 8 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.7 и 10 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 24 календарни месеца, считано от датата на подписване на протокол образец №2.

Договорените видове работи ще се изпълняват след съгласуван график с всички засегнати страни поради спецификата на обекта - ж.п. мостът над р. Сазлийка е единствената връзка на „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ с рудник „Трояново-1“, рудник „Трояново-3“, ТЕЦ „АЕС Гълъбово“, ТЕЦ „Контур Глобал“ и „Брикел“ ЕАД.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се

вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

10. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КСС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Р-л звено „Инв.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СЪГЛАСУВАЛ:

Леонид Ганозлиев

Р-л отдел „Инвестиции“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ТЕКУЩ РЕМОТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1.	КОНТАКТНА МРЕЖА						
1	РАЗБИВАНЕ БЕТОН - МАШИНО	м3	33				
2	ПИКЕТАЖ НА ЕДИНИЧНА СЪЛБОВА ЛИНИЯ	км.	0.45				
3	ВОДОЧЕРПЕНЕ РЪЧНО С КОФИ ОТ ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	6				
4	МОНТАЖ Ж.Б. КОТВА В ЗЕМНА ПОЧВА	бр.	3				
5	НАПРАВА ОБТЯЖКА КЪМ СБС	бр.	3				
6	ИЗКОП ЗА "ФИЦ-1" СДУПКОПРОБИВНА МАШИНА	бр.	12				
7	Д-КА И М-Ж ФУНДАМЕНТИ ЗА СБС "ФИЦ-1" СУЛФАТОУСТ. Н=4000ММ В ЗЕМНА ПОЧВА	бр.	12				
8	ИЗПРАВЯНЕ СБС ТИП НЦ 460/12 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	12				
9	ИЗЛИВАНЕ НА БЕТОНОВА "ШАПКА" ЗА СБС ТИП НЦ 460/12	м3	1				
10	Н-ВА И М-Ж ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СБС КЪМ РЕЛСА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф12ММ	бр.	12				
11	Н-ВА И М-Ж ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СРС КЪМ РЕЛСА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф12ММ	бр.	6				
12	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ НА СБС И СРС	бр.	18				
13	МОНТАЖ ТАБЕЛИ "ОЖ" ЕМАЙЛИРАНИ	бр.	6				
14	НАПРАВА ОБОЗНАЧЕНИЯ "ОЖ" С ШАБЛОН	бр.	12				
15	Д-КА И М-Ж СИМЕТРИЧНИ ФИКСИРАЩИ КЛЕМИ ЗА ФИКСАТОРИ КЪМ КОНЗОЛИ	бр.	21				
16	Н-ВА АВТОМ. ЕДНОРАМЕНЕН ТРИРОЛКОВ БЛОККОМПЕНСАТОР КЪМ СБС	бр.	3				
17	ОБМАЗВАНЕ ФУНДАМЕНТ НА СБ СЪЛЪБ ТИП "ФИЦ-1" С БИТУМ	м2	112				
18	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-3. ГАБАРИТ 3.0М	бр.	7				
19	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-5. ГАБАРИТ 3.0М	бр.	1				
20	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-7 ГАБАРИТ 3.0М	бр.	9				
21	Д-КА, М-Ж И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП С5, ГАБ. 3М ЗА СТРЕЛКИ	бр.	1				
22	РАЗВИВАНЕ МЕДЕН КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК RI 100ММ2	км.	0.45				
23	ДОСТАВКА МЕДЕН КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК RI 100ММ2	км.	0.45				
24	СМАЗВАНЕ РЕЗБИ С АНТИКОРОЗИЙНА СМАЗКА НА КОНЗОЛА	бр.	270				
25	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА СЪЛЪБ	тона	4.91				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
26	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА СТЬЛБ	тона	4.91				
27	НАПРАВА И МОНТАЖ ПЛАНКИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА КОНТАКТНАТА МРЕЖА	кг	300				
28	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	5.21				
29	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ M20 L=350 КЛАС 8.8	бр.	24				
30	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	96				
31	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.	48				
32	ПОЛАГАНЕ НА НЕСВИВАЕМ ЦИМЕНТОВ Р-Р ЗА ПОДЛИВКА	м3	0.1				
33	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	100				
34	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	100				
35	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	м2	100				
	1. КОНТАКТНА МРЕЖА						
	2. ЖП мост Реконструкция						
	I. Земни работи						
1	ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10СМ	100 м2	30				
2	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТА ДО 10СМ	100 м2	30				
3	ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф ДО 45СМ	бр.	30				
4	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф45СМ	бр.	30				
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1200				
6	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1200				
7	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 0,3 КМ	тона	2160				
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	1200				
9	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ Н=2до4м ОТ 1 СТРАНА	м2	200				
10	НАПРАВА НА УПЛЪТНЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ	м3	2400				
	I. Земни работи						
	II. Демонтаж и разрушаване						
11	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИЦИ И СТОМАНОТЪРЪБНИ СТЬЛБОВЕ С ДЪЛЖ.ДО 9 1/2 М. ДО 300 КГ.	бр.	4				
13	ИЗГРЕБВАНЕ НА БАЛАСТОВА ПРИЗМА	м3	165				
14	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВО КОРИТО С d=20СМ	м3	86				
15	РАЗБИВАНЕ НА КАРБЕНИЗИРАЛ БЕТОН ПО НАДЪЛЖНИ ГРЕДИ	м3	22				
16	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА МОСТА	м3	108				
17	ТРАНСПОРТ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА СРЕДНО ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ 6.5 КМ ДО ДЕПО	м3	108				
	II. Демонтаж и разрушаване						
	III. Кофражни работи						
18	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ (КОРИТО)	м2	530				
19	КОФРАЖ ЗА ТРОТОАРНИ КОНЗОЛИ И ДР. ПОДОБНИ	м2	13				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
20	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН ПРИ МОСТОВЕ (ГРЕДИ)	м2	570				
III. Кофражни работи							
IV. Бетонни работи							
21	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 25/30 ЗА АРМИРАНИ УСТОИ, КОЛОНИ, СТЬЛБОВЕ	м3	105				
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 25/30 С ДОБАВКИ	м3	25				
23	ТРАНСПОРТ НА БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	м3	130				
24	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНОМПА	м3	130				
25	НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ С ДЕБЕЛИНА ДО 2 СМ.	10 м2	25				
IV. Бетонни работи							
V. Армировъчни работи							
26	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ АЗ	кг	25625				
27	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ	кг	525				
28	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СЛ. И ОС. СЛОЖНА 14до50ММ ОТ АЗ	кг	1860				
29	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СЛ. И ОС. СЛОЖНА 6до12ММ ОТ АЗ	кг	150				
V. Армировъчни работи							
VI. Възстановяване на съществуващи елементи							
30	ОЧУКВАНЕ ВЕРТ. БЕТОННА ПЛОСКОСТ С ЧУКЧЕТА И ИЗМИВАНЕ С ВОДНА СТРУЯ (ГРЕДИ)	м2	550				
31	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ СТОМАНИ СЪС СИЛНА РЪЖДА НА ОТКРИТО	м2	85				
32	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПРОФ. СТОМАНА СЪС СИЛНА РЪЖДА НА ОТКРИТО (ЛАГЕРИ)	м2	20				
33	СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНЕ В/У СТОМАНЕНИ ПОВЕРХНОСТИ	м2	105				
34	ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВ. С ВОДНА СТРУЯ И СЪГЪСТЕН ВЪЗДУХ (УСТОИ И КОЛОНИ)	м2	325				
35	РЕМ-ПРЪСКАНЕ НА УСТОИ И КОЛОНИ С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 1:2.2	м2	325				
VI. Възстановяване на съществуващи елементи							
VII. Настилки							
36	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕННИ ФРАКЦИИ (ПЪТИЩА ЗА ДОСТЪП)	м3	220				
37	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ	м3	250				
VII. Настилки							
VIII. Разни							
39	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М	м3	1810				
40	ВЪТРЕШНИ МАСИВНО СКЕЛЕ ОТ СМЕСЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ	м3	250				
41	ЧУГУНЕНИ ОТВОДНИТЕЛИ/КОМПЛЕКТ/	бр.	5				
42	РВС-ТРЪБИ БЕЗМУФ. С ЛЕП. ВРЪЗКИ С ДИАМ. 110 ММ. ОТВОДНИТЕЛИ	м	10				
43	ОБМАЗВАНЕ ЗАСИПАНИ ПОВЕРХНОСТИ С АСФАЛТОВ ГРУНД	м2	105				
44	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ МОСТОВА	м2	250				
45	ИМПРЕГНИРАНИ ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ ЗА НАПРЕЧНИ ФУГИ	100 м.	0.3				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
46	ПОЛАГАНЕ ВОДОУПЪЛЪЗВАЩО ПОКРИТИЕ ПО БЕГ.ПОВЪРХНОСТИ	м2	96				
47	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ - 35КГ/М	м	150				
48	ЗАЛИВАНЕ ДОПИРНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС ЗА 100М	100 м.	0.3				
49	ВОДОЧЕРПЕНЕ	МСМ	120				
50	АНКЕРНА ГРУПА ТЕГЛО НА ЕДИН ЕЛЕМЕНТ ОТ 0.030 КГ ДО 8 КГ	тона	0.5				
51	НАМАЗВАНЕ С ПАСТА ТЕС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	100 бр.	4				
52	ИЗКОП ЗА ВЪЗСТАНОВ. НА РЕЧНО КОРИТО ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	1200				
	УЩ. Разни						
	2. ЖП Мост Реконструкция						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	ПЕЧАЛБА ____ %						
	Непредвидени р-ди 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

*ЗАБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позиция от количествената сметка по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Списък
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение №1.4
към Договор №МТ...../2019г.

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц	III ст. ч.ч.	III ст. разц	коэф.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

- 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %
- 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %
- 2.3. Доставно складови разходи на материалите: %
- 2.4. Печалба:..... %
- 2.5.
- 2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка” реф.№ 71/2019г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

„ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД – гр. София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на поръчка: „Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка” реф.№ 71/2019г.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложените от нас условия са както следва:

1. Изисквания към изпълнение на строителството:

Работите ще бъдат изпълнени съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба, която урежда изпълнението на строителния процес. При изпълнение на СМР ще спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

По време на изпълнението на договора се задължаваме да извършваме почистване на площадката, както междинно, така и окончателно от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци за своя сметка, като това няма да се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

2. Срок за изпълнение:

Ще изпълним поръчката в срок: 24 (двадесет и четири) календарни месеца от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво. Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15).

Приложени Ви представяме линеен график за изпълнение на работите в предписаните от него гранични срокове за извършване на работите – Приложение №1.

3. Гаранционен срок на изпълнените СМР:

Предлагаме гаранционен срок на изпълнените работи 10 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.



Декларираме, че гаранционният срок на доставените и влагани материали, ще бъде не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

4. Качество на материалите за строителния процес.

При отчитане на извършените СМР, ще представим документи, удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали:

- Сертификати за качество на използваните материали
- Декларация за експлоатационни характеристики на използваните материали
- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“

(Описват се всички документи)

5. Приемаме условията на възложителя относно документацията съпровождаща изпълнението на поръчката, описани в т.6 от техническата спецификация.

6. Декларираме, че сме извършили оглед на обекта и сме се запознали с условията при които той ще бъде изпълняван, за което прилагаме декларация *(по образец на Възложителя)*.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:


1. Линеен график за изпълнение работите – Приложение №1
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Декларация за оглед на обекта
4. Други документи и доказателства по преценка на участника

Дата: 16.09.2019 г.

Подпис:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/


Теодор Серафимов
(име и фамилия)



||||| |||||

..... |||||

...

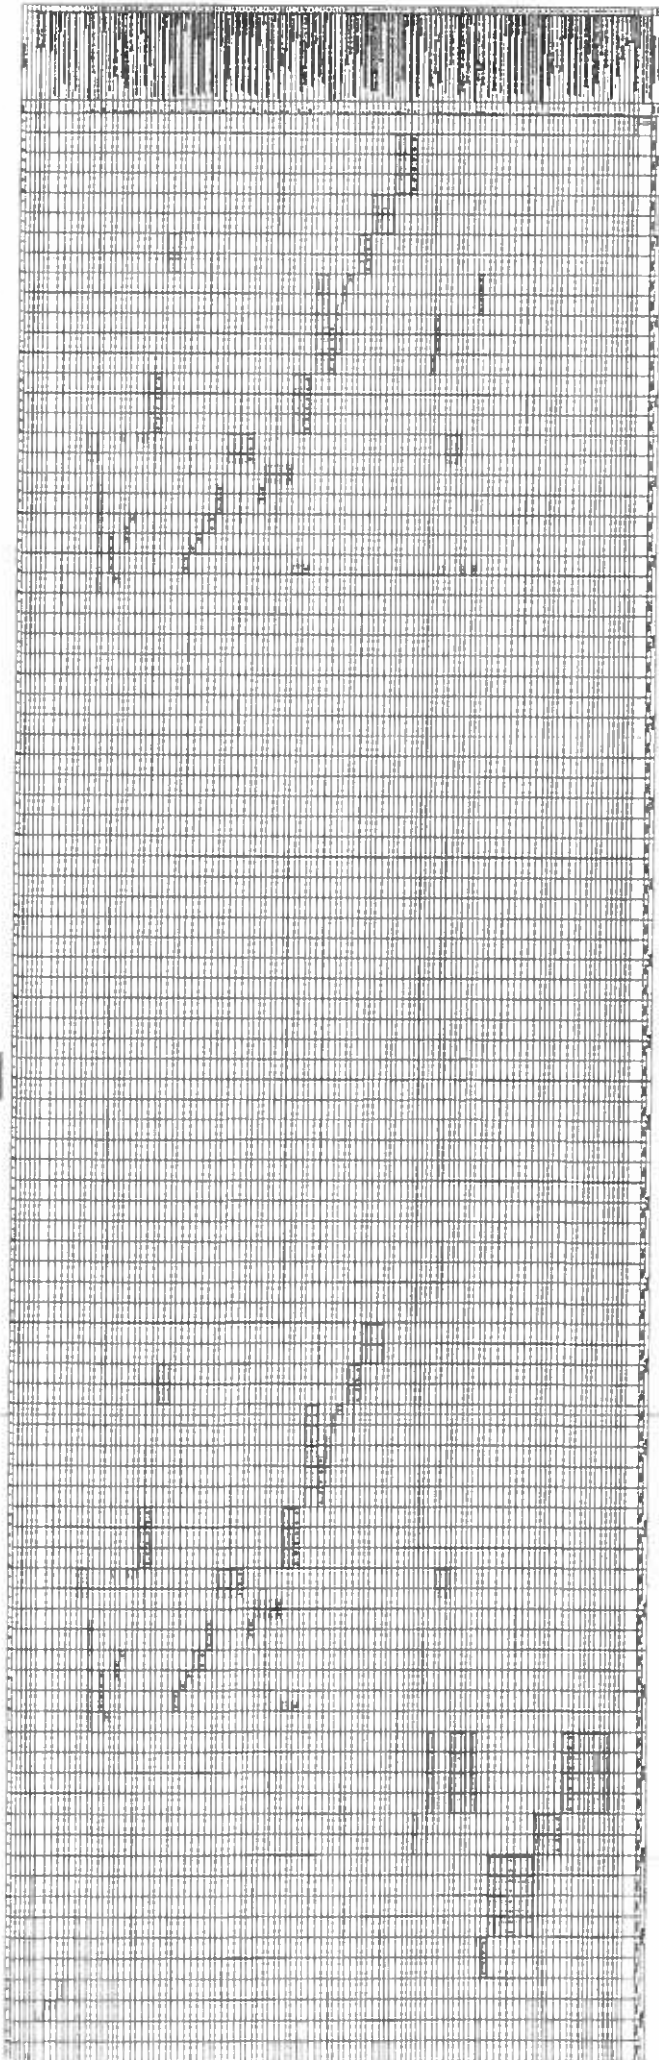

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет, „Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка“ реф.№ 71/2019г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

“ТЕС КЪНСТРАКШЪН ГРУП“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас сметна стойност за изпълнение на поръчката е както следва:

379 899,07 лева без ДДС

/словом: *Триста седемдесет и девет хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и седем стотинки* - посочва се цифром и словом стойността без ДДС/

Предложената сметна стойност може да бъде установена в ценовата таблица (количествено – стойностна сметка) неразделна част от това предложение - Приложение №1 към ценовото предложение.

Цените в офертата са без ДДС и включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите са включени в офертираната цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойности са всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размяствали редове, променяли и пропускали позиции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Приложение № 1 - Количествено – стойностна сметка с ценови показатели за формиране на цената (по образец на възложителя).
2. Приложение № 2 – Спецификация на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР (по образец на възложителя);
3. Приложение №3 - Списък на машини и оборудване, които ще се използват за изпълнение на СМР и ценоразпис на машиносмените (по образец на възложителя);



4. Приложение №4 – Цени на труда за различните специалности и степени
5. Приложение №5 – Методика за определяне на цената и условията за плащанията в това число и на допълнителните такива - при необходимост (по образец на възложителя);

С цел проверка на остойностената количествена сметка и изготвяне на договор, съгласно изискванията за оформяне на документи на Възложителя, представяме нашето предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Exel (за таблиците).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG27UNCR70001523137913 BIC: UNCRBGSF;

Банка: Уникредит Булбанк – град/клон/офис: София;

Дата: 16.09.2019г.

Подпис:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/


Гедор Серафимов
(име и фамилия)

CONSTRUCTION GROUP LTD.


КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ТЕКУЩ РЕМОТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
1. КОНТАКТНА МРЕЖА							
1	РАЗБИВАНЕ БЕТОН - МАШИННО	м3	33	30,78	1 015,74		
2	ПИКЕТАЖ НА ЕДИНИЧНА СТЬЛБОВА ЛИНИЯ	км.	0,45	47,40	21,33		
3	ВОДОЧЕРПЕНЕ РЪЧНО С КОФИ ОТ ИЗКОПИ ЗА ФУНДАМЕНТИ	м3	6	9,80	58,80		
4	МОНТАЖ Ж.Б. КОТВА В ЗЕМНА ПОЧВА	бр.	3	680,60	2 041,80	594,00	1 782,00
5	НАПРАВА ОБТЯЖКА КЪМ СБС	бр.	3	309,80	929,40	231,00	693,00
6	ИЗКОП ЗА "ФИЦ-1" С ДУПКОПРОБИВНА МАШИНА	бр.	12	14,87	178,44		
7	Д-КА И М-Ж ФУНДАМЕНТИ ЗА СБС "ФИЦ-1" СУЛФАТОУСТ. Н=4000ММ В ЗЕМНА ПОЧВА	бр.	12	756,84	9 082,08	720,50	8 646,00
8	ИЗПРАВЯНЕ СБС ТИП НЦ 460/12 В РАВНИНЕН ТЕРЕН	бр.	12	935,10	11 221,20	840,22	10 082,64
9	ИЗЛИВАНЕ НА БЕТОНОВА "ШАПКА" ЗА СБС ТИП НЦ 460/12	м3	1	95,09	95,09	84,69	84,69
10	Н-ВА И М-Ж ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СБС КЪМ РЕЛСА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф12ММ	бр.	12	20,57	246,84	6,97	83,64
11	Н-ВА И М-Ж ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА СРС КЪМ РЕЛСА С БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф12ММ	бр.	6	20,57	123,42	6,97	41,82
12	НОМЕРИРАНЕ И ДАТИРАНЕ НА СБС И СРС	бр.	18	34,67	624,06	0,25	4,50
13	МОНТАЖ ТАБЕЛИ "ОЖ" ЕМАЙЛИРАНИ	бр.	6	34,90	209,40	24,20	145,20
14	НАПРАВА ОБОЗНАЧЕНИЯ "ОЖ" С ШАБЛОН	бр.	12	3,38	40,56	0,18	2,16
15	Д-КА И М-Ж СИМЕТРИЧНИ ФИКСИРАЩИ КЛЕМИ ЗА ФИКСАТОРИ КЪМ КОНЗОЛИ	бр.	21	67,96	1 427,16	33,00	693,00
16	Н-ВА АВТОМ. ЕДНОРАМЕНЕН ТРИРОЛКОВ БЛОККОМПЕНСАТОР КЪМ СБС	бр.	3	468,08	1 404,24	418,00	1 254,00
17	ОБМАЗВАНЕ ФУНДАМЕНТ НА СБ СТЬЛБ ТИП "ФИЦ-1" С БИТУМ	м2	112	7,14	799,68	1,74	194,88
18	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-3. ГАБАРИТ 3.0М	бр.	7	981,78	6 872,46	762,30	5 336,10
19	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-5. ГАБАРИТ 3.0М	бр.	1	1 011,48	1 011,48	792,00	792,00
20	МОНТАЖ И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-7 ГАБАРИТ 3.0М	бр.	9	1 070,88	9 637,92	851,40	7 662,60
21	Д-КА, М-Ж И РЕГУЛИРАНЕ ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП С5, ГАБ. 3М ЗА СТРЕЛКИ	бр.	1	1 348,08	1 348,08	1 128,60	1 128,60
22	РАЗБИВАНЕ МЕДЕН КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК R1 100ММ2	км.	0,45	1 198,40	539,28		
23	ДОСТАВКА МЕДЕН КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК R1 100ММ2	км.	0,45	15 407,70	6 933,47	15 407,70	6 933,47
24	СМАЗВАНЕ РЕЗБИ С АНТИКОРОЗИЙНА СМАЗКА НА КОНЗОЛА	бр.	270	0,66	178,20	0,06	16,20
25	НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА СТЬЛБ	тона	4,91	2 586,52	12 699,81	1 565,26	7 685,43



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
26	МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА СТЬЛБ	тона	4,91	632,72	3 106,66	46,53	228,46
27	НАПРАВА И МОНТАЖ ПЛАНКИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА КОНТАКТНАТА МРЕЖА	кг	300	3,69	1 107,00	2,17	651,00
28	ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ	тона	5,21	12,87	67,05		
29	ДОСТАВКА НА АНКЕРНИ ШПИЛКИ M20 L=350 КЛАС 8.8	бр.	24	4,83	115,92	4,83	115,92
30	ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр.	96	0,21	20,16	0,21	20,16
31	ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр.	48	0,09	4,32	0,09	4,32
32	ПОЛАГАНЕ НА НЕСВИВАЕМ ЦИМЕНТОВ Р-Р ЗА ПОДЛИВКА	м3	0,1	176,25	17,63	125,05	12,51
33	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	100	36,80	3 680,00	14,08	1 408,00
34	ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	100	3,17	317,00	0,97	97,00
35	БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО СЪС СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	м2	100	5,06	506,00	1,68	168,00
	1. КОНТАКТНА МРЕЖА				77 681,67		55 967,29
	2. ЖП Мост Реконструкция						
	I. Земни работи						
1	ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА ДО 10CM	100 м2	30	70,00	2 100,00		
2	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТА ДО 10CM	100 м2	30	429,00	12 870,00		
3	ИЗСИЧАНЕ ЕДИН ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф ДО 45CM	бр.	30	4,40	132,00		
4	ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН ДЪРВЕТА РЪЧНО С Ф45CM	бр.	30	27,00	810,00		
5	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	1200	3,08	3 696,00		
6	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	1200	2,37	2 844,00		
7	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 0,3 КМ	тона	2160	0,57	1 231,20		
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	1200	3,25	3 900,00		
9	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ Н=2до4м ОТ 1 СТРАНА	м2	200	11,24	2 248,00	1,92	384,00
10	НАПРАВА НА УПЛЪТНЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ	м3	2400	2,94	7 056,00		
	I. Земни работи				36 887,20		384,00
	II. Демонтаж и разрушаване						
11	ДЕМОНТАЖ ПРОВОДНИЦИ И СТОМАНОТЪРЪБНИ СТЬЛБОВЕ С ДЪЛЖ.ДО 9 1/2 М. ДО 300 КГ.	бр.	4	126,88	507,52		
13	ИЗГРЕБВАНЕ НА БАЛАСТОВА ПРИЗМА	м3	165	4,16	686,40		
14	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ БЕТОНОВО КОРИТО С d=20CM	м3	86	30,78	2 647,08		
15	РАЗБИВАНЕ НА КАРБОНИЗИРАЛ БЕТОН ПО НАДЛЪЖНИ ГРЕДИ	м3	22	119,90	2 637,80	0,20	4,40
16	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА МОСТА	м3	108	4,16	449,28		
17	ТРАНСПОРТ НА БЕТОНОВИ ОТПАДЪЦИ НА СРЕДНО ТРАНСПОРТНО РАЗСТОЯНИЕ 0,5 КМ ДО ДЕПО	м3	108	12,87	1 389,96		
	II. Демонтаж и разрушаване				8 318,04		4,40
	III. Кофражни работи						
18	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ (КОРИТО)	м2	530	28,62	15 168,60	7,48	3 964,40
19	КОФРАЖ ЗА ТРОТОАРНИ КОНЗОЛИ И ДР. ПОДОБНИ	м2	13	29,63	385,19	1,41	18,33

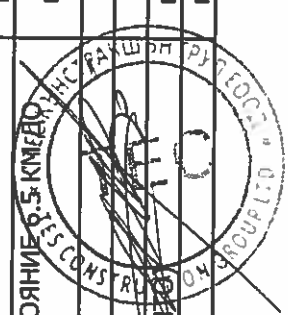


Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР			в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Ед. цена	Стойност
20	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА ВИДИМ БЕТОН ПРИ МОСТОВЕ (ГРЕДИ)	М2	570	32,25	18 382,50	9,99		5 694,30
	III. Ковражни работи				33 936,29			9 677,03
	IV. Бетонни работи							
21	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 25/30 ЗА АРМИРАНИ УСТОИ, КОЛОНИ, СТЬЛБОВЕ	М3	105	126,83	13 317,15	109,67		11 515,35
22	ПОЛАГАНЕ БЕТОН С 25/30 С ДОБАВКИ	М3	25	199,40	4 985,00	149,32		3 733,00
23	ТРАНСПОРТ НА БЕТОНОВИ Р-РИ С АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛ НА 20 КМ	М3	130	16,73	2 174,90			
24	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНОПМПА	М3	130	11,97	1 556,10			
25	НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ С ДЕБЕЛИНА ДО 2 СМ.	10 М2	25	96,97	2 424,25	32,97		824,25
	IV. Бетонни работи				24 457,40			16 072,60
	V. Армировъчни работи							
26	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 14до50ММ ОТ АЗ	КГ	25625	1,76	45 100,00	1,36		34 850,00
27	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ	КГ	525	1,99	1 044,75	1,37		719,25
28	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СЛ. И ОС. СЛОЖНА 14до50ММ ОТ АЗ	КГ	1860	1,78	3 310,80	1,36		2 529,60
29	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - СЛ. И ОС. СЛОЖНА 6до12ММ ОТ АЗ	КГ	150	2,03	304,50	1,37		205,50
	V. Армировъчни работи				49 760,05			38 304,35
	VI. Възстановяване на съществуващи елементи							
30	ОЧУКВАНЕ ВЕРТ. БЕТОННА ПЛОСКОСТ С ЧУКЧЕТА И ИЗМИВАНЕ С ВОДНА СТРУЯ (ГРЕДИ)	М2	550	12,50	6 875,00			
31	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ СТОМАНИ СЪС СИЛНА РЪЖДА НА ОТКРИТО	М2	85	36,80	3 128,00	14,08		1 196,80
32	ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПРОФ. СТОМАНА СЪС СИЛНА РЪЖДА НА ОТКРИТО (ЛАГЕРИ)	М2	20	36,80	736,00	14,08		281,60
33	СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНЕ В/У СТОМАНИ ПОВЪРХНОСТИ	М2	105	13,01	1 366,05	9,61		1 009,05
34	ПОЧИСТВАНЕ И ИЗМИВ. С ВОДНА СТРУЯ И СГЪСТЕН ВЪЗДУХ (УСТОИ И КОЛОНИ)	М2	325	2,09	679,25	0,01		3,25
35	РЕМ-ПРЪСКАНЕ НА УСТОИ И КОЛОНИ С ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР 1:2:2	М2	325	10,23	3 324,75	1,03		334,75
	VI. Възстановяване на съществуващи елементи				16 109,05			2 825,45
	VII. Настилки							
36	ПОДОСНОВЕН ПЛАСТ ОТ КАМЕННИ ФРАКЦИИ (ПЪТИЩА ЗА ДОСТЪП)	М3	220	24,44	5 376,80	17,04		3 748,80
37	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) РАБОТНИ ПЛОЩАДКИ	М3	250	31,40	7 850,00	18,54		4 635,00
	VII. Настилки				13 226,80			8 383,80
	VIII. Разни							
39	ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500КГ/М2 И Н=или<20М	М3	1810	3,79	6 859,90	0,35		633,50
40	ВЪТРЕШНИ МАСИВНО СКЕЛЕ ОТ СМЕСЕН ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ	М3	250	20,61	5 152,50	4,21		1 052,50
41	ЧУГУНЕНИ ОТВОДНИТЕЛИ/КОМПЛЕКТ/	БР.	5	189,39	946,95	165,39		826,95
42	РВС-ТРЪБИ БЕЗМУФ. С ЛЕП. ВРЪЗКИ С ДИАМ. 110 ММ. ОТВОДНИТЕЛИ	М	10	14,86	148,60	4,86		48,60
43	ОБМАЗВАНЕ ЗАСИПАНИ ПОВЪРХНОСТИ С АСФАЛТОВ ГРУНД	М2	105	2,28	239,40	0,88		92,40
44	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ МОСТОВА	М2	250	21,67	5 417,50	12,47		3 117,50
45	ИМПРЕГНИРАНИ ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ ЗА НАПРЕЧНИ ФУГИ	100 М.	0,3	475,44	142,63	464,64		139,39



Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
46	ПОЛАГАНЕ ВОДОУСТОЙЧИВО ПОКРИТИЕ ПО БЕГ.ПОВЪРХНОСТИ	m2	96	5,99	575,04	1,13	108,48
47	НАПРАВА НА СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ - 35КГ/М	М	150	104,10	15 615,00	70,51	10 576,50
48	ЗАЛИВАНЕ ДОПИРНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС ЗА 100М	100 м.	0,3	782,70	234,81	392,70	117,81
49	ВОДОЧЕРПЕНЕ	МСМ	120	85,20	10 224,00		
50	АНКЕРНА ГРУПА ТЕГЛО НА ЕДИН ЕЛЕМЕНТ ОТ 0.030 КГ ДО 8 КГ	тона	0,5	4 275,00	2 137,50	4 015,00	2 007,50
51	НАМАЗВАНЕ С ПАСТА ТЕС ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	100 бр.	4	498,96	1 995,84	98,96	395,84
52	ИЗКОП ЗА ВЪЗСТАНОВ. НА РЕЧНО КОРИТО ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ТРАНСПОРТ	м3	1200	3,25	3 900,00		
	VIII. Разни				53 589,67		19 116,97
	2. ЖП Мост Реконструкция				236 284,50		94 768,60
	ОБЩА СТОЙНОСТ				313 966,17		150 735,89
	ПЕЧАЛБА 10 %				31 396,62		
	Непредвидени р-ди 10%				34 536,28		
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				379 899,07		

*ЗАБЕЛЕЖКА - да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в позицията от количествената сметка по настоящата обществена поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:


СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст. Фирма, обекта, лв.	Фирма производител
1	Ж.Б. КОТВА	бр	3,00	540,00	10,00	1 782,00	СИМАТ АД
2	ОБТЯЖКА КЪМ СБС	бр	3,00	210,00	10,00	693,00	ТрансКом'с
3	ФУНДАМЕНТИ "ФИЦ-1" СУЛФАТОУСТ. Н=4000ММ	бр	12,00	655,00	10,00	8 646,00	СИМАТ АД
4	СБС ТИП НЦ 460/12	бр	12,00	760,00	10,00	10 032,00	СИМАТ АД
5	ДЪРВЕНИ КЛИНОВЕ	м3	0,14	320,00	10,00	50,69	Модър – 2002 ООД
6	ВОДА	м3	14,40	2,30	10,00	36,43	ВИК Гълъбово
7	БЕТОН С16/20	м3	1,01	76,00	10,00	84,44	Строителство и монтаж ООД
8	БЕТОННО ЖЕЛАЗО Ф12ММ	м	57,60	1,98	10,00	125,45	Стомана Индъстри АД
9	БЛАЖНА БОЯ	кг	1,32	4,60	10,00	6,68	Органим
10	ТАБЕЛИ "ОЖ" ЕМАЙЛИРАНИ	бр	6,00	22,00	10,00	145,20	ЕЛ-ТЕСТ
11	СИМЕТРИЧНИ ФИКСИРАЩИ КЛЕМИ ЗА ФИКСАТОРИ КЪМ КОНЗОЛИ	бр	21,00	30,00	10,00	693,00	ТрансКом'с
12	ЕДНОРАМЕНЕН ТРИРОЛКОВ БЛОККОМПЕНСАТОР	бр	3,00	380,00	10,00	1 254,00	ТрансКом'с
13	БИТУМ ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН	кг	89,60	1,00	10,00	98,56	Лукойл
14	БЕНЗИН	кг	56,00	1,55	10,00	95,48	Лукойл
15	ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-3. ГАБАРИТ 3.0М	бр	7,00	693,00	10,00	5 336,10	ТрансКом'с
16	ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-5. ГАБАРИТ 3.0М	бр	1,00	720,00	10,00	792,00	ТрансКом'с
17	ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП М-7 ГАБАРИТ 3.0М	бр	9,00	774,00	10,00	7 662,60	ТрансКом'с
18	ЕДНОПЪТНА КОНЗОЛА ТИП С5, ГАБ. 3М ЗА СТРЕЛКИ	бр	1,00	1 026,00	10,00	1 128,60	ТрансКом'с

19	МЕДЕН КОНТАКТЕН ПРОВОДНИК RI 100MM2	М	456,75	13,80	10,00	6 933,47	Филкаб
20	АНТИКОРОЗИЙНА СМАЗКА	л	0,54	26,00	10,00	15,44	СТЕЛИТ ООД
21	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	кВтч	1 396,43	0,27	10,00	414,74	EVN
22	ЕЛЕКТРОДИ	кг	516,96	5,50	10,00	3 127,61	ESAB
23	ЛИСТОВА СТОМАНА	кг	2 080,36	1,40	10,00	3 203,75	Стомана Индъстри АД
24	СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ	кг	8 534,44	1,32	10,00	12 392,01	Стомана Индъстри АД
25	АНКЕРНИ ШПИЛКИ M20 L=350 КЛАС 8.8	бр	24,00	4,39	10,00	115,90	Руболт АД
26	ГАЙКИ M20 БДС EN ISO 4032:2003 /клас на якост 8.8/	бр	96,00	0,19	10,00	20,06	Руболт АД
27	ШАЙБИ M20 ISO 7090	бр	48,00	0,08	10,00	4,22	Руболт АД
28	НЕСВИВАЕМ ЦИМЕНТОВ Р-Р	м3	0,10	112,00	10,00	12,50	Строителство и монтаж ООД
29	ДЪРВА	кг	0,82	0,04	10,00	0,04	Модър - 2002 ООД
30	МАРКУЧ ГУМЕН	м	6,56	3,60	10,00	25,98	Plexaco
31	МРЕЖА (СИТО)	кг	0,00	1,50	10,00	0,00	TOSITA
32	МУНДШУЦИ(ДЮЗИ)	бр.	0,00	3,15	10,00	0,00	BOSCH
33	ПЯСЪК КВАРЦОВ	кг	13 530,00	0,19	10,00	2 827,77	КАОЛИН
34	ТЕНЗУХ	м2	16,40	1,70	10,00	30,67	Вратица - Враца АД
35	ГРУНД ЗА МЕТАЛИ	кг	22,00	4,00	10,00	96,80	Органим
36	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	1,30	3,95	10,00	5,65	Органим
37	ШКУРКА	м	9,00	1,10	10,00	10,89	sia Abrasives
38	СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ	кг	23,00	6,00	10,00	151,80	Органим
39	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,30	270,00	10,00	89,10	Модър - 2002 ООД
40	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,30	260,00	10,00	85,80	Модър - 2002 ООД
41	СКОБА ДЪРВОДЕЛСКА	кг	69,00	1,50	10,00	113,85	Жити АД
42	ТАЛПИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,60	306,00	10,00	201,96	Модър - 2002 ООД
43	ШИЛА ЗА КЪРНАЧ	бр	0,22	18,00	10,00	4,36	Reppsteig
44	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	5,10	290,00	10,00	1 628,30	Модър - 2002 ООД
45	ДЪСКИ КОФРАЖНИ	м3	28,64	230,00	10,00	7 244,68	Модър - 2002 ООД
46	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	111,30	3,20	10,00	391,78	Индустриална химия ООД
47	ПИРОНИ	кг	225,17	1,60	10,00	396,29	Модър - 2002 ООД
48	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	5,30	1,85	10,00	10,79	Метиз
49	БЕТОН C25/30	м3	131,95	98,00	10,00	14 224,21	Строителство и монтаж ООД
50	ДОБАВКА ЗА БЕТОН	кг	112,50	8,01	10,00	991,24	PENETRON HELLAS
51	ЦИМЕНТЕН РАЗТВОР 1:2,2	м3	8,97	118,00	10,00	1 163,66	Строителство и монтаж ООД
52	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ НА АРМИРОВКА	кг	84,48	1,80	10,00	167,27	Метиз
53	СТОМАНА БЕТ. Ф 14-50 ММ ТИП А3	кг	28 172,13	1,20	10,00	37 187,21	Стомана Индъстри АД
54	СТОМАНА БЕТ. Ф 6-12 ММ ТИП А3	кг	685,13	1,22	10,00	919,44	Стомана Индъстри АД
55	ЦИНКОВА БОЯ "ZINGA"	кг	29,40	31,20	10,00	1 009,01	Органим

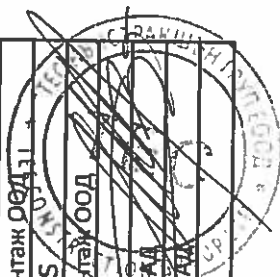


56	ВОДА	м3	61,44	2,50	10,00	168,96	Вик Гълъбово
57	ЧАКЪЛ	м3	336,50	12,80	10,00	4 737,92	Инермат АД
58	КАМЪК ТРОШЕН	м3	290,00	10,90	10,00	3 477,10	Инермат АД
59	ТРЪБНО СКЕЛЕ ПОДПОРНО	м3	1 810,00	0,32	10,00	637,12	Храмър ЕООД
60	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ ДЯЛАНИ	м3	1,13	290,00	10,00	358,88	Модър – 2002 ООД
61	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ ДЯЛАНИ	м3	1,13	270,00	10,00	334,13	Модър – 2002 ООД
62	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,13	250,00	10,00	34,38	Модър – 2002 ООД
63	ДЪСКИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,13	240,00	10,00	33,00	Модър – 2002 ООД
64	ПИРОНИ	кг	108,00	1,60	10,00	190,08	Жити АД
65	ЧУГУНЕНИ ОТВОДНИТЕЛИ/КОМПЛЕКТ/	бр	5,00	150,00	10,00	825,00	Габро Метал 2000 ЕООД
66	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,06	19,30	10,00	1,27	Henkal AGS
67	PVC ТРЪБИ НЕМУФИРАНИ Ф 110	м	10,30	4,17	10,00	47,25	Пайп индустриал България
68	АСФАЛТОВ ГРУНД	кг	33,60	2,50	10,00	92,40	Вълков
69	БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	кг	1 050,00	2,70	10,00	3 118,50	Изола Петров
70	ИМПРЕГНИРАНИ ДЪРВЕНИ ЛЕТВИ	м3	0,26	480,00	10,00	139,39	Модър – 2002 ООД
71	ИМПРЕГНАТОР ЗА БЕТОН	кг	36,48	2,70	10,00	108,35	RENETRON HELLAS
72	АСФАЛТОВА СМЕС ЗА ФУГИ	кг	63,00	1,70	10,00	117,81	Пътища и мостове ЕООД
73	АНКЕРНА ГРУПА	т	0,50	3 650,00	10,00	2 007,50	Акорд 67 ЕООД
74	АЦЕТОН	кг	13,20	4,20	10,00	60,98	Оргакхим
75	ВТВЪРДИТЕЛ	кг	4,40	11,00	10,00	53,24	Оргакхим
76	ПАСТА ТЕС	кг	40,00	6,40	10,00	281,60	Оргакхим

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

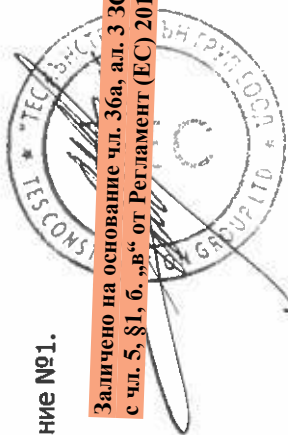


СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

използвани за изпълнение на СМР на подобект:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

№	Видове механизация (специални инструменти)	Машиносмени	Цена на една машиносмена, лв.	доп. разходи, %	стойност, лв.
1	БАГЕР	43,24600	320,00	30,00	17 990,34
2	МОНТАЖНА МАШИНА	3,28200	320,00	30,00	1 365,31
3	АВТОВИШКА	11,31750	280,00	30,00	4 119,57
4	ДУПКОПРОБИВНА МАШИНА	0,52800	260,00	30,00	178,46
5	ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	144,52756	1,80	30,00	338,19
6	ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	15,76110	4,00	30,00	81,96
7	АВТОКРАН	17,98983	290,00	30,00	6 782,17
8	ЪГЛОШЛАЙФ	48,78410	1,20	30,00	76,10
9	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	0,23445	220,00	30,00	67,05
10	КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН 8 м3/мин	9,52000	92,00	30,00	1 138,59
11	ТОРКРЕТНА УРЕДБА ЕДНОКАМЕРНА	8,20000	68,00	30,00	724,88
12	САМОСВАЛ	9,18000	220,00	30,00	2 625,48
13	БУЛДОЗЕР	23,30200	240,00	30,00	7 270,22
14	ТОВАРАЧ	4,06770	215,00	30,00	1 136,92
15	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН КОМПЛ.	2,86000	9,00	30,00	33,46
16	АВТОБЕТОНОСМИТЕЛ	4,29000	390,00	30,00	2 175,03
17	АВТОБЕТОНОПМПА	2,44400	490,00	30,00	1 556,83
18	ВОДОСТРЪЙКА	13,00000	1,60	30,00	27,04
19	ВАЛЯК СТАТИЧЕН САМОХОДЕН ДО 10 Т	10,66600	160,00	30,00	2 218,53
20	ПОДЕМНИК МАЧТОВ	41,94000	9,00	30,00	490,70
21	ЕЛ. ПОМПА	120,00000	4,00	30,00	624,00



Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: **30,00** %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Приложение №1.4
към Договор №МТ...../2019г.


ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

ТЕКУЩ РЕМОТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	ЕЛ.МОНТЪОР	96,54300	5,00 лв.	102,64500	5,00 лв.			1,00
2	ИЗКОПЧИЯ	1 111,48000	5,00 лв.	104,80000	5,00 лв.			1,00
3	МОНТАЖНИК СЪБК	19,82400	5,00 лв.	19,82400	5,00 лв.			1,00
4	БЕТОНДЖИЯ	840,84700	5,00 лв.	398,05900	5,00 лв.			1,00
5	РАБОТНИК	1 790,47000	5,00 лв.	546,38600	5,00 лв.			1,00
6	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК	176,29000	5,00 лв.	222,94600	5,00 лв.			1,00
7	МОНТАЖНИК МК	362,95860	5,00 лв.	503,36496	5,00 лв.			1,00
8	БОЯДЖИЯ	17,00000	5,00 лв.	38,85000	5,00 лв.			1,00
9	КОФРАЖИСТ	827,04700	5,00 лв.	1 444,14700	5,00 лв.			1,00
10	НАСТИЛКАДЖИЯ	80,00000	5,00 лв.	80,00000	5,00 лв.			1,00
11	АРМАТУРИСТ	324,45650	5,00 лв.	684,17000	5,00 лв.			1,00
12	МАЗАЧ	214,50000	5,00 лв.	149,50000	5,00 лв.			1,00
13	ДЪРВОДЕЛЕЦ	588,53900	5,00 лв.	443,92000	5,00 лв.			1,00

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ Ж.П. МОСТ НАД Р. САЗЛИЙКА

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - 2.1. Допълнителни разходи в/у труда : **100,00 %**
 - 2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: **30,00 %**
 - 2.3. Доставно складови разходи на материалите: **10,00 %**
 - 2.4. Печалба: **10,00 %**
 - 2.5.
 - 2.6.
4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.
5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Потърпява се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

