



№ 00001.90651641 П-НА СТ/СТ: 120 346.00

ДОГОВОР

№ МТ-...302... / 2017 г.

Днес, 23.08 2017 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции“**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново-1“, с.Трояново** и

~~„ЖИЛМЕН-Ж” ЕООД, гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.„Калоянско шосе” №2А, тел: 042/639007, факс: 042/638691, e-mail: jilmen@dir.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:202807165, ИН по ДДС: BG202807165; представлявано от Жельо Маринов Желев-управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящия Договор за следното:~~

на основание утвърден Протокол №54/26.07.2017г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“ – реф.№38/2017 – ОПнс**, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане: **извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за *обекти V-та група*, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf)

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Сметната стойност на Договора е **69 781.61 лева** (шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и един лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност 63 437,83 без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност): 6 343,78 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количества СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).


2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:UNCRBGSF

IBAN:BG89UNCR70001521613121

БАНКА: УниКредит Булбанк АД, гр.Стара Загора



2.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.11. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е **3 489,08 лева**, което е 5% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

3.6. Възложителят инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за същественият изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”, „Наредба за същественият изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението” и „Наредба за маркировката за съответствие”.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е територията на Възложителя – промплощадката в рудник „Трояново -1“, с.Трояново.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до 4 (четири) месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите и плащанията – Приложение №2 към настоящия договор.



5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи – **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.


6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.



9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.4. С окончателното му изпълнение;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;



11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му в следните хипотези:

12.1.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .

12.1.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.1.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

12.2. Сроктът за изпълнение на договора може да бъде удължен при настъпване на неблагоприятни метеорологични условия и фактори, които правят невъзможно изпълнението, удостоверено с двустранно подписан протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР между упълномощени представители на възложителя и изпълнителя.

12.3. Сроктът на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

12.4. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

13. ПОДСЪДНОСТ

13.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са

изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Стефан Анков
Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев
Ръководител отдел „Инвестиции“

Снежана Варелова
Ст.юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:
Виолета Куртева
Експерт търговия, отдел „Търговски“



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЖЕЛЪО ЖЕЛЕВ
Управител





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ**

(строителство-СМР)

1. Пълно описание на предмета на поръчката

**Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката
на рудник "Трояново-1"**

Място на изпълнение: Промплощадката в р-к „Трояново-1“

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка

Извършената дейност по Количествената сметка ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж. Мария Йорданова-част АС, ХТС,НС.

3. Категория на строежа: отделни видове СМР.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – Всички дейности се изпълняват в съответствие с изискванията на Възложителя и работния проект.

Ако е необходимо при изготвяне на офертата кандидатите могат да се запознаят с работния проект в стаи 508 и 503 на отдел „Инвестиции“.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по изпълнение и контрол на строителството.

6. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема

и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
 - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
 - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
 - ✓ ценообразуването на непредвидените СМР става с икономическите показатели на действащия договор;
 - ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
 - Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
 - Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
 - За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
 - Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
 - Изпълнителят ще предостави Констативен акт обр. 15 на Възложителя.
 - Фактура
7. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
- Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
- Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (загл. изм. - дв. бр. 92 от 2013 г.)

8. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

9. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е до 4 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

ИЗГОТВИЛ:

Живко Желев

Ръководно „Инв.контрол“

СЪГЛАСУВАЛ:

Леопид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЖИЛМЕН-Ж ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: BG202807165

седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. Калояновско шосе № 2А,
тел.: 042/639 007, факс: 042/638 691, e-mail: jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“ – реф.№38/2017 – ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 1971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 4 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия /ниво, съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Приемо – предавателен протокол м/у страните (Констативен акт обр.15.)

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение №3.

Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката.

Всички документи в процеса на строителство ще се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение.

Съгласни сме приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец, като за целта се съставят протоколи за действително извършените дейности, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение № 2 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Приложение №3 - Линеен график за изпълнение на работите .


Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата: 28.06.2017г.

Подпис: _____

Жельо Желев
(име и фамилия)



Линеен график за изпълнение на работите
/в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/
за обект:

„Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“ – реф.№38/2017 – ОПНС


№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	Чове- кодни	I месец				II месец				III месец				IV месец			
			1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.	1 седм.	2 седм.	3 седм.	4 седм.
1	1. ЗЕМНИ РАБОТИ	220																
2	2. ТРЪБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ	145																
	КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПИТАНИЯ	10																
	ПРИЕМАТЕЛНА КОМИСИЯ																	
	ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЕРИОД	15	3															
	ОБЩО ЗА ОБЕКТА	390																

Диаграма на работната ръка

15 раб.
10 раб.
5 раб.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

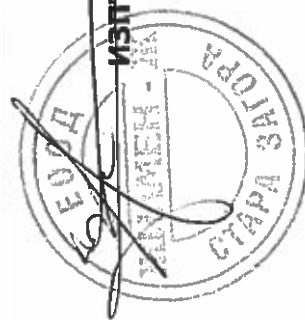

Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ЖИЛМЕН-Ж ЕООД
ЕИК 202807165

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Калояновско шосе № 2А,
тел.: 042/639 007 факс: .042/638 691, e-mail:jilmen@dir.bg

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на
рудник „Трояново-1“ – реф.№38/2017 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, общата стойност на нашата оферта без
ДДС възлиза на : 69 781,61лв.

Словом: Шестдесет и девет хиляди седемстотин осемдесет и един лв 61ст.

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.
Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,
представена от Възложителя, като сме я остойностили, така както е посочено, без да сме
правили промени.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични
цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни
Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:


- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение
на поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените, използвани за
изпълнение на СМР
- В) Спецификация на единичните цени на материалите, доставка на изпълнителя

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

Дата: 28.06.2017г.

Подпис: _____

Жельо Желев
(име и фамилия)

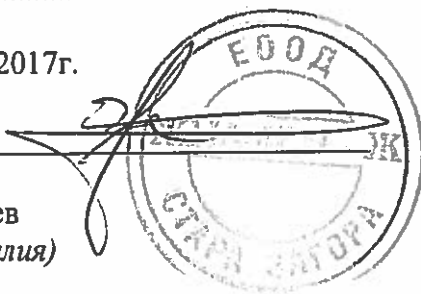

„Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“ – реф.№38/2017 – ОПНС

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	колич.	СМР	
				Ед. цена	Стойност
1. ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	МСМ	25	6,00	150,00
2	РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20СМ	М ²	46	8,00	368,00
3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 25СМ С ОГР.ШИРИНА	М ²	46	45,00	2 070,00
4	РАЗБИВАНЕ СТМАНОВЕТОН. НАСТИЛКА, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА С ОКСИЖЕН	М ²	114	13,00	1 482,00
5	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА d=35 - ДВОЙНО АРМИРАНА С ф10 КАРЕ 10/	10 М ³	4	1850,00	7 400,00
6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ - ХУМУСЕН СЛОЙ	М ³	70	3,60	252,00
7	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. 3. М. ОТ МЯСТО , ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО-ХУМУСЕН СЛОЙ	М ³	70	5,10	357,00
8	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛ-В БАНКЕТА НА ПЪТЯ	М ³	76	5,10	387,60
9	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ИЗК. 3. М. ОТ МЯСТО,ВКЛ.ТРАМБ.Е,РЪЧНО-В БАНКЕТА	М ³	76	5,10	387,60
10	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,2М НА ТРАНСПОРТ	М ³	752	4,50	3 384,00
11	ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗМ	М ³	67	8,00	536,00
12	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	М ³	18	8,00	144,00
13	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	М ³	67	26,00	1 742,00
14	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	М ³	176	26,00	4 576,00
15	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	М ³	660	20,00	13 200,00
16	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	М ³	752	1,50	1 128,00
17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	М ³	300	1,90	570,00
18	УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	М ²	2 148	0,22	472,56
	всичко за т.1 ЗЕМНИ РАБОТИ				38 606,76
2. ТРЪБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ					
19	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. БЪРЗА ВРЪЗКА Ф25 PN16	М	2	8,00	16,00
20	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. БЪРЗА ВРЪЗКА Ф63 PN10	М	2	18,00	36,00
21	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ВОД. ПЕВП ТРЪБИ В ИЗКОП, ВКЛ. БЪРЗА ВРЪЗКА Ф90 PN10	М	775	18,50	14 337,50
22	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ Ф50ММ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ	М	2	8,00	16,00
23	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА БЪРЗА ВРЪЗКА Ф25	бр.	2	8,00	16,00

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	колич.	СМР	
				Ед. цена	Стойност
56	ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ				
	всичко за т.2 тръби и съоръжения	м	735	1,50	1 102,50
	ВСИЧКО				22 983,37
	ПЕЧАЛБА 3 %				61 590,13
	ОБЩА СТОЙНОСТ				1 847,70
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%				63 437,83
	СМЕТНА СТОЙНОСТ				6 343,78
					69 781,61

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
- Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
 - Цена за труд: I ст.: 3,20 лв./ч.ч., II ст.: 3,10 лв./ч.ч., III ст.: 3,00 лв./ч.ч.
 - Допълнителни разходи в/у труда : 100 %
 - Допълнителни разходи в/у механизацията: 30 %
 - Доставно складови разходи на материалите: 10 %
 - Доставно складови разходи за материалите на възложителя: 10 % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.
- Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инв. контрол:

М.Йорданова-част АС, ХТС, НС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТАРА ЗАГОР

„Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“ –
 реф.№38/2017 – ОПНС

СПИСЪК


на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
 използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	0,43	450,00	30,00	251,84
2	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	7,42	450,00	30,00	4 340,61
3	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	0,46	360,00	30,00	215,28
4	КАМИОН Б	0,41	720,00	30,00	382,49
5	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП "БИБО"В-2125 С ДЕБШТ 66.6	25,00	4,62	30,00	149,99
6	САМОСВАЛ	1,44	600,00	30,00	1 126,20

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

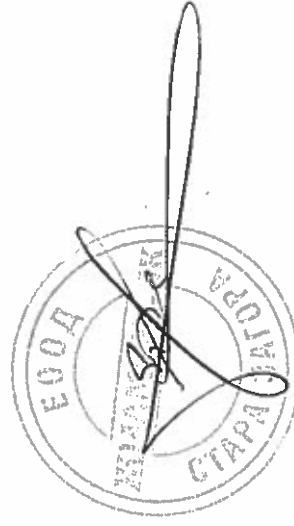

„Извършване на ремонтни работи на водопровод от в. В1 до промплощадката на рудник „Трояново-1“ –
 реф.№38/2017 – ОПНС

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	Доп. разходи, %	Ст-ст франко	Фирма производител
1	ПЕВП ТРЪБИ Ф25	м	2,00	2,88	10,00	6,34	Юроком 2000
2	PVC ТРЪБИ Ф50MM	м	2,00	3,00	10,00	6,60	Юроком 2000
3	АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф1"	бр.	1,00	238,00	10,00	261,80	Юроком 2000
4	АРМАТУРА Ст.АІ Ф10	кг	500,00	1,15	10,00	632,50	Хъс ООД
5	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	368,00	4,00	10,00	1 619,20	ЕсбиЕс АД
6	БЕТОН КЛАС В 35	м3	40,00	140,00	10,00	6 160,00	Стройком ООД
7	ВАР ХЛОРНА	кг	1,78	5,00	10,00	9,80	ЕТ Згура
8	ВОД. ПЕВП ТРЪБИ Ф63 с свър.елементи	м	2,00	10,60	10,00	23,32	Юроком 2000
9	ВОДА	м3	100,75	2,00	10,00	221,65	"Жилмен - Ж" ЕООД
10	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90x25	бр.	2,00	23,00	10,00	50,60	Юроком 2000
11	ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	м	735,00	1,03			Юроком 2000
12	ЗАВАРЯЕМ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	2,00	49,09	10,00	828,71	Юроком 2000
13	КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10	бр.	5,00	26,00	10,00	143,00	Юроком 2000
14	Крепек за тръби	кг	20,90	4,20	10,00	96,56	ИТП АД
15	МЕТАЛЕН КАПАК ЗА ШАХТА 1.6/2.0M	бр.	1,00	150,00	10,00	165,00	Юроком 2000
16	Опорен блок	бр.	5,00	28,00	10,00	154,00	"Жилмен - Ж" ЕООД
17	ПЕВП ТРЪБИ Ф90 със свързв.елем.	м	775,00	11,00	10,00	9 377,50	Юроком 2000
18	ПЯСЪК	м3	243,00	16,00	10,00	4 276,80	Бертран АД

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
N.1	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 КВ	МСН				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ПОМПА ЗА ВОДА ТИП "БИБО" В-2125 С ДЕБШТ 66.6	МСН	1,000	4,62	1,000	4,62
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,38
	всичко преки					4,62
	всичко допълнителни р-ди					1,38
	Обща цена :					6,00
N.2	РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20СМ	М2				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧЧ	1,333	3,00	1,000	4,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			100,00		4,00
	всичко преки					4,00
	всичко допълнителни р-ди					4,00
	Обща цена :					8,00
N.3	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.ДО 25СМ С ОГР.ШИРИНА	М2				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	КГ	8,000	4,00	1,000	32,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	ВАЛЖК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ДО 3Т	МСН	0,010	360,00	1,000	3,60
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	0,800	3,20	1,000	2,56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,08
	доп.р-ди труд (%)			100,00		2,56
	всичко преки					38,16
	всичко допълнителни р-ди					6,84
	Обща цена :					45,00
N.4	РАЗБИВАНЕ СТМАНОВЕТОН. НАСТИЛКА, ВКЛ ИЗРЯЗВАНЕ НА АРМАТУРАТА С ОКСИЖЕН	М2				
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	ЧЧ	2,167	3,00	1,000	6,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			100,00		6,50
	всичко преки					6,50
	всичко допълнителни р-ди					6,50
	Обща цена :					13,00
N.5	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА d=35 - ДВОЙНО АРМИРАНА С ф10 КАРЕ 10/	10 М3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	БЕТОН КЛАС В 35	М3	10,000	140,00	1,000	1400,00
2	АРМАТУРА Ст.А1 Ф10	КГ	125,000	1,15	1,000	143,75
						1543,75
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	ЧЧ	11,782	3,20	1,000	37,70
2	Работник I ст.	ЧЧ	11,949	3,20	1,000	38,24
						75,94
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		154,38
	доп.р-ди труд (%)			100,00		75,94
	всичко преки					1619,69
	всичко допълнителни р-ди					230,31
	Обща цена :					1850,00
N.6	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ - ХУМУСЕН СЛОЙ	М3				

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	всичко преки					4,00
	всичко допълнителни р-ди					4,00
	Обща цена :					8,00
N.13	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНА, ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	м3	1,000	16,00	1,000	16,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,312	3,20	1,000	4,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,60
	доп.р-ди труд (%)			100,00		4,20
	всичко преки					20,20
	всичко допълнителни р-ди					5,80
	Обща цена :					26,00
N.14	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК, ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ПЯСЪК	м3	1,000	16,00	1,000	16,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,312	3,20	1,000	4,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,60
	доп.р-ди труд (%)			100,00		4,20
	всичко преки					20,20
	всичко допълнителни р-ди					5,80
	Обща цена :					26,00
N.15	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК, ВКЛ.ТРАМБОВАНЕ	м3				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Трошляк	м3	1,000	16,00	1,000	16,00
	ТРУД :					
1	Работник II ст.	чч	0,388	3,10	1,000	1,20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		1,60
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,20
	всичко преки					17,20
	всичко допълнителни р-ди					2,80
	Обща цена :					20,00
N.16	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 5КМ	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	САМОСВАЛ	мсм	0,002	600,00	1,000	1,15
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,35
	всичко преки					1,15
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	Обща цена :					1,50
N.17	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.УПРАВЛ.	мсм	0,003	450,00	1,000	1,46
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,44
	всичко преки					1,46
	всичко допълнителни р-ди					0,44
	Обща цена :					1,90
N.18	УКРЕПВАНЕ ПЛЪТНО, ВКЛ. РАЗКРЕПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ	м2				

ном.	име	маса	р.м.	цена	коэф.	стойн.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			100,00		4,00
	всичко преки					4,00
	всичко допълнителни р-ди					4,00
	Обща цена :					8,00
N.24	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА БЪРЗА ВРЪЗКА Ф63	бр.				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	2,813	3,20	1,000	9,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			100,00		9,00
	всичко преки					9,00
	всичко допълнителни р-ди					9,00
	Обща цена :					18,00
N.25	МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ НА ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ПЕВП ТРЪБИ НА БЪРЗА ВРЪЗКА DN90	бр.				
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	3,906	3,20	1,000	12,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)			100,00		12,50
	всичко преки					12,50
	всичко допълнителни р-ди					12,50
	Обща цена :					25,00
N.26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	КОЛЯНО НА БЪРЗА ВРЪЗКА ПЕВП Ф90 90° PN10	бр.	1,000	26,00	1,000	26,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,156	3,20	1,000	3,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,60
	доп.р-ди труд (%)			100,00		3,70
	всичко преки					29,70
	всичко допълнителни р-ди					6,30
	Обща цена :					36,00
N.27	ДОСТАВКА ТРОЙНИК ПЕВП Ф90 PN10	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТРОЙНИК ПЕВП Ф90 PN10	бр.	1,000	50,00	1,000	50,00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		5,00
	всичко преки					50,00
	всичко допълнителни р-ди					5,00
	Обща цена :					55,00
N.28	ДОСТАВКА ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/63	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ ЗАВАРЯЕМ ПЕВП Ф90/63	бр.	1,000	38,18	1,000	38,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,82
	всичко преки					38,18
	всичко допълнителни р-ди					3,82
	Обща цена :					42,00
N.29	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"МЪЖКА РЕЗБА	бр.	1,000	28,18	1,000	28,18
	ДОП.РАЗХОДИ:					

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		4,91
	всичко преки					49,09
	всичко допълнителни р-ди					4,91
	Обща цена :					54,00
N.35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90x25	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВОДОВЗЕМНА СКОБА ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90x25	бр.	1,000	23,00	1,000	23,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,516	3,20	1,000	4,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,30
	доп.р-ди труд (%)			100,00		4,85
	всичко преки					27,85
	всичко допълнителни р-ди					7,15
	Обща цена :					35,00
N.36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф1"	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф1"	бр.	1,000	238,00	1,000	238,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	2,844	3,20	1,000	9,10
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		23,80
	доп.р-ди труд (%)			100,00		9,10
	всичко преки					247,10
	всичко допълнителни р-ди					32,90
	Обща цена :					280,00
N.37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА ПЕВП ТРЪБИ Ф90	бр.	1,000	21,00	1,000	21,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,610	3,20	1,000	1,95
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,10
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,95
	всичко преки					22,95
	всичко допълнителни р-ди					4,05
	Обща цена :					27,00
N.38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф90	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф90	бр.	1,000	21,00	1,000	21,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,610	3,20	1,000	1,95
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,10
	доп.р-ди труд (%)			100,00		1,95
	всичко преки					22,95
	всичко допълнителни р-ди					4,05
	Обща цена :					27,00
N.39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф90 ГЛУХ	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	СТОМАНЕН ФЛАНЕЦ Ф90 ГЛУХ	бр.	1,000	33,00	1,000	33,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,516	3,20	1,000	4,85
	ДОП.РАЗХОДИ:					

НОМ.	ИМЕ	МАРКА	Р.Ч.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
	Обща цена :					35,00
N.45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСАДНА ТРЪБА ЗА АВТ.ВЪЗДУШНИК	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	Тръба стоманена	кг	12,000	2,80	1,000	33,60
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	3,500	3,20	1,000	11,20
2	Работник I ст.	чч	3,225	3,20	1,000	10,32
						21,52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		3,36
	доп.р-ди труд (%)			100,00		21,52
	всичко преки					55,12
	всичко допълнителни р-ди					24,88
	Обща цена :					80,00
N.46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф63	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф63	м	1,000	3,38	1,000	3,38
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,200	3,20	1,000	0,64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,34
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,64
	всичко преки					4,02
	всичко допълнителни р-ди					0,98
	Обща цена :					5,00
N.47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф90	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ТОПЛОИЗОЛ. С ПОЛИУРЕТАН 50ММ И ЗАЩИТНА ОБШИВКА ЗА Ф90	м	1,000	6,00	1,000	6,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	0,218	3,20	1,000	0,70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,60
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,70
	всичко преки					6,70
	всичко допълнителни р-ди					1,30
	Обща цена :					8,00
N.48	ТРАНСПОРТ НА ТРЪБИ ПЕВП НА 150КМ	тона				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КАМИОН Б	мсм	0,240	720,00	1,000	173,07
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)			30,00		51,92
	всичко преки					173,07
	всичко допълнителни р-ди					51,92
	Обща цена :					225,00
N.49	НАПРАВА НА РШ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОбЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РШ С ОТВОР Ф60СМ ОТ СГЛОбЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М	бр.	1,000	850,00	1,000	850,00
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	13,000	3,20	1,000	41,60
2	Работник I ст.	чч	12,782	3,20	1,000	40,90
						82,50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		85,00
	доп.р-ди труд (%)			100,00		82,50
	всичко преки					932,50

ном.	име	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойн.
N.55	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф200ММ	100 м.				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ВАР ХЛОРНА	кг	0,230	5,00	1,000	1,15
2	ВОДА	м3	13,000	2,00	1,000	26,00
						27,15
	ТРУД :					
1	Работник I ст.	чч	1,000	3,20	1,000	3,20
2	Работник I ст.	чч	1,000	3,20	1,000	3,20
						6,40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		2,71
	доп.р-ди труд (%)			100,00		6,40
	всичко преки					33,55
	всичко допълнителни р-ди					9,12
	Обща цена :					42,66
N.56	ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	м				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	ДИЕЛЕКТРИЧНА (ОБОЗНАЧИТЕЛНА) ЛЕНТА ЗА ВОДОПРОВОДИ	м	1,000	1,02	1,000	1,02
	ТРУД :					
1	Работник III ст.	чч	0,062	3,00	1,000	0,19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			10,00		0,10
	доп.р-ди труд (%)			100,00		0,19
	всичко преки					1,21
	всичко допълнителни р-ди					0,29
	Обща цена :					1,50
