



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



АОВ: 00265-2018-0022; н-чл ст/ст: 1 090 000,00

ДОГОВОР

№ МТ-...363.. / 2018 г.

Днес, 17.10...2018 г. в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител на договора от страна на възложителя и отговорник по отчета на договора е:

- Рудник „Трояново-север” с. Ковачево

Контрол по изпълнението на договора от страна на възложителя ще се извършва от следните отдели на „Мини Марица-изток“ ЕАД - Управление :

- „Производствено - технологичен”
- „Маркшайдерски”
- „Геоложки”

и

„Министрой Холдинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София п.к. 1700, бул. „Д-р. Г.М.Димитров” № 57, тел: 02/9635555, факс: 02/9624250; e-mail: bonev@minstroy.com, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:831493848, ИН по ДДС: BG 831493848; представлявано от **Неделчо Аспарухов Бонев** – Изпълнителен директор и **Николай Георгиев Вълканов** – Председател на Съвета на директорите, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение № МТ – 04 - 2807/ 31.07. 2018 г. на Изпълнителния директор и Протокол № 14-2018/27.07.2018 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на Обособена позиция №3 от обществена поръчка с предмет: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции” – реф.№ КС 16-2017-01, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане с автосамосвали на 375 000 м³ откривка от трети участък на трето насипищно стъпало от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, за нуждите на рудник „Трояново-север”. Предметът на договора включва изпълнение на следните дейности:



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” - №13
тел.: 0417 / 8 33 05; факс: 0417 / 8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

- а) Направа на временен чакълиран път по маршрута, показан на приложената ситуация.
- б) Изкопните дейности да се извършват съобразно естествения отток на повърхностните и подпочвени води, като се поддържат в годно техническо състояние каналите за отводняване.
- в) Изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товарачи на земни маси с общ обем 375 000 м³ на указаните на ситуациите места.
- г) Транспортиране с автосамосвали на обемите по обособената позиция с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км, средно 4 км от забоя на багерите до булдозерните насипища на указаните на ситуациите места.
- д) Устройване на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина 3 м на земните маси по обособената позиция с общ обем 375 000 м³ на указаните на ситуациите места.
- е) Поддържане на временен път по указаните маршрути (ремонт, почистване, оросяване и др.).
- ж) Почистване кошовете на самосвалите.
- з) Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променени в рамките на договореното средно транспортно разстояние.

1.2. Вид на материала: глина терциерна, на цвят сивозелена и сивочерна, от откривката на рудник „Трояново-1“, депонирана при свободно насипване с абзетцер преди повече от 25 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост.

1.3. Обемно тегло на плътна маса: от 1,5 т/м³ до 1,8 т/м³. С по-високо обемно тегло е сивозелената глина.

1.4. Изчислителното натоварване на основата на временния път, при естествена влажност на насипа (без да бъде преувлажнен от атмосферни валежи) е : $R_0 = 0.8 \text{ кг/см}^2$.

1.5. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на договора, която е образувана към датата на решението за определяне на изпълнител е **1 083 750,00 лева, без ДДС**. Тя е формирана при:

а) офериранията от Изпълнителя единична цена за 1 куб. метър плътна маса в размер на **2,89 лв. без ДДС** ;

б) обем откривка (375 000 куб.м.), която трябва да бъде изкопана, натоварена, транспортирана, насипана и разстлана;

в) цена на горивото: **1605,00 лв./1000 л. без ДДС**.

2.2. При ежемесечни плащания, единичната цена за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на 1 куб. метър плътна маса се изменя, съгласно цената на дизеловото гориво в последния работен ден на отчетния период (месеца предхождащ фактурирането), по следната формула:

$$Ц = (0,7202 * Ц_{Гдг} / 1000) + 1,7340, \text{ където:}$$

Ц – цената, по която възложителят ще извърша плащането при изпълнение на договора;
К=0,7202 – коефициент, изчислен на база предложената единична цена (2,89 лв.) по следната формула $K = (0,4 * 2,89) / 1,605$. (частното от четиридесет процента от предложената цена 2,89 лв., без ДДС и цената на горивото 1,605 лв./1000 л., посочена от възложителя. За целия срок на изпълнение на договора коефициентът не подлежи на промяна;



ЦГдг - цената на "Лукойл България" ООД база „Лукойл - Нефтохим“ на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л. без ДДС в последния работен ден на отчетния период;

X=1,7340 – постоянна съставка, която представлява 60% от предложената цена за 1 куб.м. плътна маса – 2,89 лв., без ДДС ($X=0,60 \cdot 2,89=1,7340$).

2.3. Единичната цена на 1 м³ включва всички разходи на Изпълнителя, за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на един кубичен метър откритка. В нея са включени и разходи за спомагателни дейности за единица обем, като устройване на булдозерно насипище, направа, оросяване и поддържане на временен път, почистване на кошовете на самосвалите, утежнени условия, разходи за охрана на обекта, превоз на работници и др. както и калкулираната печалба.

2.4. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени работи през съответния календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на издаване на фактура от Изпълнителя за ежемесечно изпълнените работи, след съставяне на Протокол за установяване, завършване и изплащане на натурални видове СМР, изготвен въз основа на маркшайдерски замер, извършен от представители на Възложителя в присъствието на представители на Изпълнителя. При ежемесечните плащания за база се взема цената на "Лукойл - България" ООД, база „Лукойл - Нефтохим“ на дизелово гориво със съдържание на биодизел минимум 6 процента обемни в лв./1000 л. без ДДС в последния работен ден на отчетния период (месеца предхождащ фактурирането)

В случай, че със нормативен акт бъде променено съдържанието на задължителната биокомпонентата в дизеловото гориво, цените да бъдат формирани по законоустановената цена на горивото.

б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни, считано от датата на констативен протокол за отчитане на цялостното изпълнение и установяване годността за приемане обекта (участъка). При прекратяване на договора, поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, има право да удържи изчислените суми на дължимите санкции и неустойки по договора от задържаните 10%, като разликата се изплаща на Изпълнителя в 30-дневен срок от прекратяването на договора.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG81STSA 9300 0021 8066 57

БАНКА: „Банка ДСК“ ЕАД – София/Корпоративен център

2.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.1. Срок на изпълнение е до **12 (дванадесет) месеца** от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 куб. м.

3.2. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

3.3. До 15 дни от датата на получаване на писмено уведомление от Възложителя, Изпълнителят е длъжен:

- Да се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извърши следните дейности:

- Да се яви за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“



- Да устрои временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);

- Да извърши организация на работа;

- Да построи временен път.

Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откритка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график.

3.4. Изпълнителят се задължава за сравнително сухия период на годината - месеците май, юни, юли, август и септември задължителния обем за изпълнение да е не по-малко от **60 000 м³** плътна земна маса на месец,

- за месец октомври задължителния обем за изпълнение да е минимум **50 000 м³** плътна земна маса,

или

- общо за благоприятния лятно-есенен период **350 000 м³** плътна земна маса.

Оставащите обеми от **25 000 м³** плътна земна маса ще се разпределят по месеци както следва:

- от първи ноември до края на април следващата година.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложения в графика, но в случай, че забави изпълнението, същият се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора.

3.5. Мястото на изпълнение на договора е: трети участък на вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“.

3.6. Сроковете за изпълнение на поръчката са съобразени с коефициентите на устойчивост на I ви насипищен хоризонт.

3.7. Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от посочения за отчетния период, но в случай, че забави изпълнението дължи неустойки, съгласно раздел 8 от договора.

3.8. Изпълнителят се задължава да извърши услугата на свой риск.

3.9. Приемането на извършената работа по количество и качество, измерването и отчитането на изкопаните, натоварени, транспортирани, насипани и разстлани обеми земна маса се извършва един път месечно, през първата работна седмица на месеца следващ изпълнението, от отдел „Маркшайдерски“ на рудника и в присъствието на представител на Изпълнителя. Извършва се маркшайдерски замер на плътната земна маса в масива. Изготвя се протокол за извършените дейности, след което се оформя фактура за стойността на месечно извършената работа. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви на замера, Изпълнителят е длъжен да приеме безусловно резултатите от маркшайдерския замер на възложителя.

4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

4.1. На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя Възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената услуга. Сроктът за възражения за недостатъци и дефекти е 5 дни от датата на констатирането им.

4.2. Сроктът и начинът за отстраняване на недостатъците и дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативен протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

4.3. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и дефекти за своя сметка.


5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. на Възложителя

5.1. Да предаде на Изпълнителя:

- а) Маркирани граници на строителната площадка, на която ще се работи;

- б) Петна на площадките с първоначални коти, на които ще се извозва почвата и които ще се подравняват, след изграждане на временен път до булдозерното насипище от Изпълнителя.



5.2. Да осъществява постоянно техническо ръководство във връзка с работите, предмет на договора и извършва маркшайдерски замер.

5.3. Да дава указания за коти, наклони и други технически изисквания, необходими на Изпълнителя за непрекъснат и качествен работен процес.

5.4. В седемдневен срок от датата на подписване на договора да осигури площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя.

Б. На Изпълнителя

5.5. Да изпълни качествено и в приетите срокове по договора възложената му работа, като спазва изискванията на всички нормативни документи, всички ведомствени правилници и инструкции.

5.6. Да води заповедна книга на обекта.

5.8. Да подравнява и оформя работните площадки и насипищните депа, с цел осигуряване възможност за извършването на максимално точен маркшайдерски замер. При неизпълнение на това задължение от страна на Изпълнителя, Възложителя има право да откаже извършването на замер.

5.9. Да изпълнява договора съгласно уговореното в него и в техническото предложение.

6. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

6.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

7. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

7.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни минималните месечни обеми за изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане, уговорени в графика, същият дължи неустойка, в размер на 15% върху стойността на уговореното, но неизпълнено количество кубически метра плътна земна маса за съответния месец.

8.2. Възложителят има право едностранно да прекрати договора при трайно неизпълнение на минималните месечни обеми от графика за три последователни месеца. В този случай на прекратяване на договора, Възложителят инкасира /усвоява/ в своя полза гаранцията за изпълнение на договора, представена от Изпълнителя.

8.3. В случай, че Изпълнителят в 15 дневен срок от получаване на писменото уведомление от Възложителя не се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка), или не извърши някоя от дейностите по т.3.3 от настоящия договор, същият дължи на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 0,5 % на ден върху стойността на договора, но не повече от 15% от стойността му. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят може едностранно да прекрати договора. В този случай договора се прекратява и Възложителят инкасира /усвоява/ в своя полза гаранцията за изпълнение на договора, представена от Изпълнителя.

8.4. Ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора.

8.5. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата.

9. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства.

9.1.1. За непредвидени обстоятелства се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

9.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 9.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непредвидените обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

10.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и да спрат действието му, когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които не е отговорен Изпълнителя. При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, се подписва двустранен протокол между страните за спиране на изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на дейностите. Срокът на договора може да бъде удължен с времето през което поради лоши атмосферни условия не е бил изпълняван.

10.2. За времето на удължаване на срока на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

10.3. Страните могат да изменят настоящия договор и в следните хипотези:

10.3.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

10.3.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

10.3.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счеете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

10.3.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

10.4. И в двете хипотези (по чл. 10.3.1 и чл. 10.3.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

10.5. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.


10.6. И в двете хипотези (по чл. 10.3.1 и чл. 10.3.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

11. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.1. С изтичане на срока по т.3.1. или при достигане на определения обем от 375 000 куб. м.

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;



11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

11.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

13. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 54 187,50 лв. - 5% от цената на договора по т.2.1.

13.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

13.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

13.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да прекрати договора.

13.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

13.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.



13.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

13.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

13.9. В случаите на чл.9, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

14.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

14.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

14.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

14.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

14.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породви правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.



15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилага Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЕДЕЛЧО БОНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА

Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Емил Колев
Ръководител отдел „Търговия“

Митко Донев
Ръководител отдел „Проектиране и консултантски услуги“

Павел Карачолов
Ръководител отдел „Геоложки изследвания“

Илия Карагяуров
Ръководител отдел „Проектиране и консултантски услуги“

Снежана Варелова
Старши юристконсулт, „Договорно право“

Изготвил:
Виолета Тотева –
Експерт търговия, отдел „Търговия“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ**

„Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 м³ откритка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”, за нуждите на рудник „Трояново-север” през 2018 и 2019 година”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 - Изкопаване, транспортиране и насипване с автосамосвали на 375 000 м³ откритка от Участък №3 на III^{то} насипищно стъпало:

(строителство-СМР)

Период	Участък №3
Обеми – за срока на изпълнение на договора.	375 000 м ³

1. Цел на поръчката:

Поръчката включва вторично изкопаване, транспортиране и депониране на откритка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1”, което се извършва с цел осигуряване развитието на минните работи на рудник „Трояново-север” при постигане на коефициент на устойчивост Куст $\geq 1,00$ и постигане на планувания годишен добив на въглища през 2018 и 2019 год.

2. Технически изисквания към предмета на процедурата:

Поръчката включва следните дейности:

- Направа на временен чакълиран път по маршрута, показан на приложената ситуация.
- Изкопните дейности да се извършват съобразно естествения отток на повърхностните и подпочвени води, като се поддържат в годно техническо състояние каналите за отводняване.
- Изкопаване и товарене с еднокотови багери на земни маси и/или челни товариачи по обособена позиция №1 с общ обем 375 000 м³ на указаните на ситуациите места.
- Транспортиране с автосамосвали на обемите по обособена позиция №3 с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км, средно 4 км от забоя на багерите до булдозерните насипища на указаните на ситуациите места.
- Устройване на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина 3 м на земните маси по обособена позиция №3 с общ обем 375 000 м³ на указаните на ситуациите места.
- Поддържане на временен път по указаните маршрути (ремонт, почистване, оросяване и др.).
- Почистване кошовете на самосвалите.
- Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променени в рамките на договореното средно транспортно разстояние.

3. Изисквания към технологията на изпълнението:

Срок на изпълнение на поръчката по обособената позиция (участък) е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 куб. м. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

В седемдневен срок от датата на подписване на договора Възложителят осигурява площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя и изпраща писмено уведомление до Изпълнителя /по факс или по пощата с обратна разписка/.

До 15 дни от датата на получаване на писмено уведомление Изпълнителят е длъжен:

- Да се яви за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извърши следните дейности:
- Да се яви за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“
- Да устрои временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);
- Да извърши организация на работа;
- Да построи временен път.

Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откритка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график.

3.1. Условия на възложителя относно изпълнението на графика:

След подписването на договора за изпълнението на дейностите се съставя график за разпределение на общия обем от **375 000 м³** на изкопно-транспортните и насипищните земни работи (по месеци за целия срок за изпълнение на договора).

Графикът се изготвя от Възложителя и се подписва от двете страни по договора. В него се определят минималните месечни обеми за изпълнение на дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане.

За сравнително сухия период на годината, месеците май, юни, юли, август и септември задължителния обем за изпълнение е не по-малко от **60 000 м³** плътна земна маса, -за месец октомври задължителния обем за изпълнение е минимум **50 000 м³** плътна земна маса или

-общо за благоприятния лятно-есенен период **350 000 м³** плътна земна маса.

Оставащите обеми от **25 000 м³** плътна земна маса ще се разпределят по месеци както следва:

-от първи ноември до края на април следващата година.

Графикът ще бъде съобразен със съответната дата за стартиране на изпълнението на дейностите (пълнен/непълнен месец-при необходимост минималния обем ще се разпредели между първия и последния месец) както и с необходимите подготвителни дейности.

При обстоятелства независещи от страните по договора и зависимост от технологичните нужди на Възложителя по време на изпълнение на дейностите, Възложителя има право да предложи нов график за изпълнение (съобразен с описаните по-горе обеми) и да промени мястото за депониране и изкопаване на откритката в рамките на транспортното разстояние. Промяната се извършва с подписване на допълнително споразумение между страните.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложените в графика, но в случай, че забави изпълнението, същия се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора. При трайно неизпълнение на минималните месечни обеми от графика в три последователни месеца, Възложителя има право да прекрати едностранно договора със съответните последствия за Изпълнителя.

При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, се подписва протокол между страните за спиране на изпълнението. При отпадане на причините за спирането се подписва протокол между страните за продължаване на изпълнението на дейностите.

Срокът на договора може да бъде удължен с времето през което поради лоши атмосферни условия не е бил изпълняван.

3.2. Изпълнението на дейностите по договора се съобразява с коефициентите на устойчивост.

-Обем плътна земна маса за изкопаване **375 000 м³**

-Транспортно разстояние от **3,5 км** до **4,5 км**, или средно **4 км**.

-Вид на материала: глина терциерна, на цвят сиво-зелена и сиво-черна, от откривката на рудник „Трояново-1“, депонирана при свободно насипване с абзетцер преди повече от 25 години, консолидирана и уплътнена от собственото си тегло. Глините са с по-високо водно съдържание от тези в естествения масив и с голяма лепливост.

-Обемно тегло на плътната маса: от $1,5 \text{ т/м}^3$ до $1,8 \text{ т/м}^3$. С по-високо обемно тегло е сиво-зелената глина.

-Коефициента на разбухване: $K_{\text{разб.}} = 1,25$

-Изчислителното натоварване на основата на временния път, при естествена влажност на насипа (без да бъде преувлажнен от атмосферни валежи): $R_0 = 0,8 \text{ кг/см}^2$.

-Измерването и отчитането на изкопаните, транспортирани и насипани обеми земна маса се отчитат по маркшайдерски замер на плътната земна маса в масива. Замерите се правят един път месечно през първата работна седмица на месеца, от отдел „Маркшайдерски“ на рудника и в присъствието на представител на Изпълнителя. Отчитането и разплащането ще се извършва със съответните протоколи за установяване на извършените дейности, по крайна договорена цена за метър кубичен, обхващаща всички разходи на Изпълнителя за единица обем по предмета на поръчката.

4. Възражения за недостатъци:

На всеки етап от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи към Изпълнителя възражение за недостатъци и/или появили се дефекти при изпълнението на извършената услуга. Срокът за възражения е 5 дни от датата на констатирането им.

Срокът и начинът за отстраняване на недостатъците и/или дефектите се съгласуват между Възложителя и Изпълнителя в констативен протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 1 месец от датата на протокола.

Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци и/или дефекти за своя сметка.

ИЗГОТВИЛИ:

Илия Карагяуров

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л отдел „Маркшайдерски“

Павел Карачолов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л отдел „Геоложки“

Петър Банов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД


Главен инж. минен - технология и анализи

СЪГЛАСУВАЛ:

Митко Донев

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л отдел Производствено-технологичен

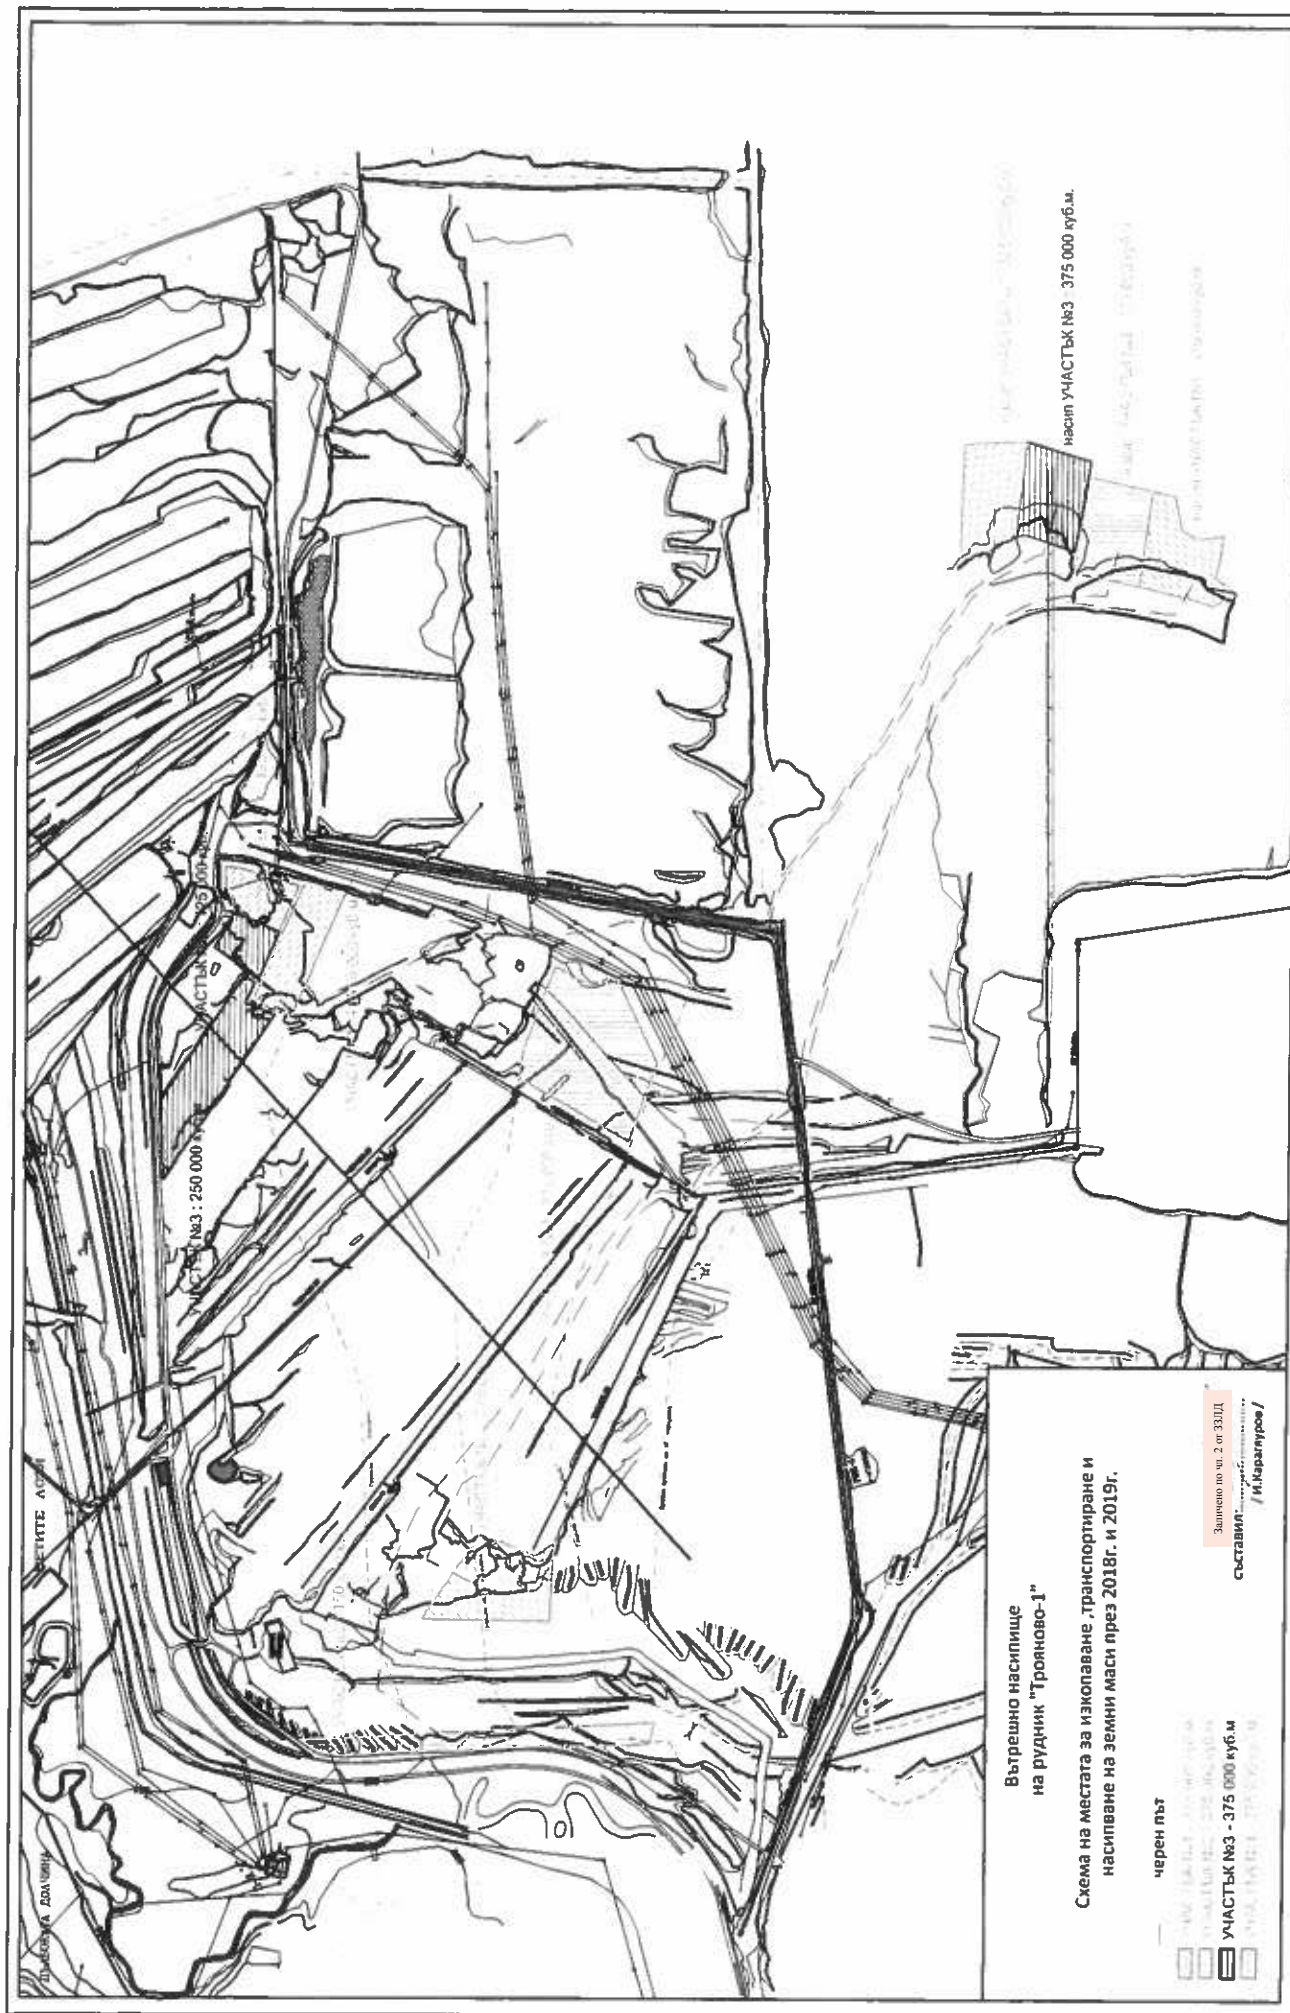

3.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

***ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево ” – реф.№ КС 16-2017-01

Обособена позиция № 3 - Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 375 000 куб.м. откривка от трети участък на трето насипищно стъпало

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

„МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД - ГР. СОФИЯ

бул. „Д-р Г.М. Димитров“ - №57

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно описаните в документацията условия, нашата ценова оферта за Обособена позиция №3 (попълва се обособената позиция, за която се подава оферта) е както следва:

Единичната цена за изпълнение предмета на обособената позиция, е както следва:

2,89 лева/куб.м., без ДДС

При формирането на единичната цена за 1 куб. м плътна маса сме предвидили всички разходи за единица обем, които ще бъдат направени за изпълнението на всички дейности, предмет на обособената позиция и сме взели предвид всички изисквания на възложителя.

Предложената от нас цена е формирана съгласно изискванията на възложителя при цена на горивото 1605 лв./1000 л.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG81STSA93000021806657 BIC: STSABGSF;

Банка: „Банка ДСК“ ЕАД – град/клон/офис: София/ Корпоративен център;

Дата: 02.07.2018 год.

Подпис:

Николай Вълканов

(име и фамилия)

Подпис:

Неделчо Бонев

(име и фамилия)

Наименование: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“, реф.№ КС 16-2017-01

Възложител: Мини Марица-изток“ ЕАД

3. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

3.1. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

***ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ СЕ ПОПЪЛВА ОТДЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево ” – реф.№ КС 16-2017-01

Обособена позиция № 3 - Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 375 000 куб.м. откривка от трети участък на трето насипищно стъпало

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
ГРАД РАДНЕВО

От:

Участник: „Минстрой Холдинг“ АД,

Адрес за кореспонденция: гр. София – 1700, бул. „Д-р Г.М.Димитров“ №57

тел.: 02/963-55-55, факс: 02/962-42-50, e-mail: bonev@minstroy.com

Лице за контакти: Неделчо Бонев

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие по обособена позиция № 3 от обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево ” – реф.№ КС 16-2017-01, обявена чрез квалификационна система, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и поканата и приети от нас.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и условията на обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в документацията, поканата и техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложи в приложения към документацията за участие проект на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката по обособената позиция, изискван от възложителя.

Наименование: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“, реф.№ КС 16-2017-01

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:

1. Спецификация на дейностите:

- Направа на временен чакълиран път по маршрута, показан на приложената ситуация.
- Изкопните дейности да се извършват съобразно естествения отток на повърхностните и подпочвени води, като се поддържат в годно техническо състояние каналите за отводняване.
- Изкопаване и товарене с еднокофови багери и/или челни товариачи на земни маси по обособена позиция №3 с общ обем 375 000 м³ на указаните на ситуациите места.
- Транспортиране с автосамосвали на обемите по обособена позиция №3 с общ обем 375 000 м³ на разстояние от 3,5 км до 4,5 км, средно 4 км от забоя на багерите до булдозерните насипища на указаните на ситуациите места.
- Устройване на булдозерно насипище за насипване и разстилане на слоеве с височина 3 м на земните маси по обособена позиция №3 с общ обем 375 000 м³ на указаните на ситуациите места.
- Поддържане на временен път по указаните маршрути (ремонт, почистване, оросяване и др.).
- Почистване кошовете на самосвалите.
- Устройване на временна база, охрана на базата и др. спомагателни дейности.

По време на изпълнение на дейностите, в зависимост от фактическите технологични възможности и нужди на Възложителя и по негово предложение, участъците за изкопаване и насипване могат да бъдат променени в рамките на договореното средно транспортно разстояние.

2. Срок за изпълнение на поръчката:


Срокът на изпълнение на поръчката по обособената позиция (участък) е до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до достигане на определения обем от 375 000 куб. м. Договорът влиза в сила от датата на подписване.

В седемдневен срок от датата на подписване на договора Възложителят осигурява площадка за местодомуването на използваната механизация от Изпълнителя и изпраща писмено уведомление до Изпълнителя /по факс или по пощата с обратна разписка/.

До 15 дни от датата на получаване на писменото уведомление се задължаваме:

- Да се явим за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) и да извършим следните дейности:
- Да се явим за подписване на съответния „График за изпълнение на дейностите по Договора“
- Да устроим временна база за техниката и персонала (да достави необходимата механизация);
- Да извършим организация на работа;
- Да построим временен път.

Приемаме условието на възложителя да започнем дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане на откривка от вътрешното насипище на рудник „Трояново-1“, съгласно двустранно подписания график



Наименование: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 375 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“, реф.№ КС 16-2017-01

Възложител: „Мини Механизация“ ЕАД

2.1. Приемаме условията на възложителя относно изпълнението на графика:

След подписването на договора за изпълнението на дейностите се съставя график за разпределение на общия обем от 375 000 м³ на изкопно-транспортните и насипищните земни работи (по месеци за целия срок за изпълнение на договора).

Графикът се изготвя от Възложителя и се подписва от двете страни по договора. В него се определят минималните месечни обеми за изпълнение на дейностите по изкопаване, натоварване, транспортиране, насипване и разстилане.

За сравнително сухия период на годината, месеците май, юни, юли, август и септември задължителния обем за изпълнение е не по-малко от 60 000 м³ плътна земна маса,

- за месец октомври задължителния обем за изпълнение е минимум 50 000 м³ плътна земна маса или

-общо за благоприятния лятно-есенен период 350 000 м³ плътна земна маса.

Оставащите обеми от 25 000 м³ плътна земна маса ще се разпределят по месеци както следва:

-от първи ноември до края на април следващата година.

Графикът ще бъде съобразен със съответната дата за стартиране на изпълнението на дейностите (пълнен/непълнен месец-при необходимост минималния обем ще се разпредели между първия и последния месец) както и с необходимите подготвителни дейности.

При обстоятелства независещи от страните по договора и зависимост от технологичните нужди на Възложителя по време на изпълнение на дейностите, Възложителя има право да предложи нов график за изпълнение (съобразен с описаните по-горе обеми) и да промени мястото за депониране и изкопаване на откривката в рамките на транспортното разстояние. Промяната се извършва с подписване на допълнително споразумение между страните.

Изпълнителят може да изпълни по-голям обем от заложените в графика, но в случай, че забави изпълнението, същия се санкционира съгласно предвидените неустойки по договора. При трайно неизпълнение на минималните месечни обеми от графика в три последователни месеца, Възложителя има право да прекрати едностранно договора със съответните последствия за Изпълнителя.

При лоши атмосферни условия, които не позволяват изпълнението на дейностите съгласно подписания график, се подписва протокол между страните за спиране на изпълнението. При отпадане на причините за спирането се подписва протокол между страните за продължаване на изпълнението на дейностите.

Срокът на договора може да бъде удължен с времето през което поради лоши атмосферни условия не е бил изпълняван.

3. Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя.

Задължаваме се да изпълним поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите ще вземем всички разумни мерки за опазване на околната среда.

Работата по изпълнение обекта на договора ще бъде съобразена с приетите и утвърдени процедури и работни инструкции в „Мини Марица-изток“ ЕАД гр. Раднево, където са внедрени системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001, на околната среда в съответствие с ISO 14001 и здраве и безопасност при работа в съответствие с OHSAS 18001.

Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се материали и др. са изцяло за наша сметка.

Наименование: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на 1 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“, реф.№ КС 16-2017-01

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Стр. 2 от 4

4. Изисквания към изпълнението на дейностите по договора

4.1. Съгласни сме измерването и отчитането на изкопаните, транспортирани и насипани обеми земна маса се отчитат по маркшайдерски замер на плътната земна маса в масива. Замерите се правят един път месечно през първата работна седмица на месеца, от отдел „Маркшайдерски“ на рудника и в присъствието на представител на Изпълнителя. Отчитането и разплащането ще се извършва със съответните протоколи за установяване на извършените дейности, по крайна договорена цена за метър кубичен, обхващаща всички разходи на Изпълнителя за единица обем по предмета на поръчката.

4.2. За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената услуга се съставя констативен протокол.

5. Здравословни и безопасни условия на труд.

При извършване СМР да бъдат осигурени здравословни и безопасни условия на труд, съгласно действащите нормативни документи по техническа безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана. Задълженията на Възложителя и Изпълнителя са подробно определени в проекта на договора от документацията за участие.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Неразделна част от нашата оферта са следните приложения:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Декларация за извършен оглед – по образец на възложителя

Дата: 02.07.2018 год

Подпис:

Николай Вълканов
(име и фамилия)

Подпис:

Неделчо Бонев
(име и фамилия)

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Наименование: „Изкопаване, транспорт и насипване с автосамосвали на Т 500 000 куб.м. откривка от вътрешно насипище на рудник „Трояново-1“, с. Трояново, за нуждите на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“, реф.№ КС 16-2017-01

Възложител: Министърство на енергетиката
