



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID 3105642640

## ДОГОВОР

№ 170-06 / 2020 г.

Днес, 9.01.....2020 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: **отдел „Инвестиции”**

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: **рудник „Трояново-1”, с. Трояново**

**„Тнепгруп Метал ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев” № 38, тел: 042/924494, моб.: 0889 11 77 14; e-mail: [office@tngroup.eu](mailto:office@tngroup.eu) вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 204969130, ИН по ДДС: BG 204969130; представлявано от **Наталия Колева** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящия Договор за следното:

На основание чл.194 от Закона за обществените поръчки и утвърден Протокол № МТ-45/03.12.2019 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на санитарни помещения в цех „Механична работилница“ – реф. № 53/2019 – ОП** се сключи настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да изпълни срещу заплащане **ремонт на санитарни помещения в цех „Механична работилница“**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №3 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно техническата спецификация, указанията на Възложителя и техническото предложение на Изпълнителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Наредба №7/23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13  
Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05  
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com)

1971/29.10.2011 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството), Закона за изискванията към технически продукти и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за V-та група за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в националния класификатор на икономическите дейности, позиция „Строителство“. Вписването съответства на предмета на поръчката (42.21, 43.21, 43.22, 43.31, 43.33, 43.34 – КИД 2008г.) и ПРВВЦПРС.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_20\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_20_bg.pdf))

## **2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Цената на Договора е **29 127,05 лева** (двадесет и девет хиляди сто двадесет и седем лева и пет стотинки) без ДДС, която представлява **сметната стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност: 24 517,72 лева без ДДС,

б) печалба 8%: 1 961,42 лева без ДДС

в) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност и печалбата): 2 647,91 лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до **30 кал. дни**, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис“ (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до **30 кал. дни**, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се

заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

**2.9.** Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BGSF

IBAN: BG92 FINV 9150 1017 3558 10

БАНКА: „Първа Инвестиционна банка“ АД – клон/офис град Стара Загора

**2.10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

**2.11.** Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

**3.1.** Срокът за изпълнение на СМР е до **5,8 (пет цяло и осем) месеца**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в линеен график за изпълнение на работите, приложение към настоящия договор.

**3.2.** Мястото на изпълнение на договора е рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

**3.3.** Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

**3.4.** Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

**3.5.** Изпълнителят се задължава да изработи и представи с Констативен акт обр. 15 на възложителя екзекутивната документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяващи несъществените отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

### **4. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ**

**4.1.** Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи - 5 години, след въвеждане в експлоатация, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4, т.4 от Наредба №2 към ЗУТ;

- на доставените и влагани материали, за срок не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

**4.2.** Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

**4.3.** В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

**4.4.** Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

**4.5.** За съставянето на протокола по т. 4.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

**4.6.** Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.4.5.

**4.7.** В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.4.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

**4.8.** Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.



## **5. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

5.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **6. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

6.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/pravilnikzapropuskatelenrejimvminimaritcaiztokead2019.pdf>) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **7. НЕУСТОЙКИ**

7.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение.

7.2. При забава или неточно изпълнение, Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

7.3. Освен в случаите на подписване на акт за установяване на състоянието на обекта при спиране на изпълнението, Изпълнителят е длъжен да започне работа на обекта до 5 работни дни от датата на подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия/ниво. При неизпълнение на това задължение Възложителят има право едностранно да прекрати договора, като за целта отправи писмено уведомление.

7.4. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

7.5. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

7.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението

## **8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОР).**

8.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

8.1.1. За „непреодолима сила“ се счита определението, дадено в чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

8.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 8.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

8.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

8.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

9.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

9.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на параграф 2, т. 27 от ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от промяна.



9.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага промяната по договора.

9.1.1.2. Възложителят има право да откаже промяна на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

9.1.1.3 В горните случаи промяната на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

9.2. Страните могат да спрат действието му в следните хипотези:

9.2.1. Изпълнението на договора се спира поради:

- а) искания за изменения в проектите;
- б) неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора;
- в) забавяне доставки, когато това забавяне прави невъзможно изпълнението на други дейности по договора;
- г) неблагоприятни геоложки условия при договори за изпълнение на СМР;
- д) смяна на възложителя или изпълнителя, а за договори за изпълнение на СМР и лицето, упражняващо строителен надзор (консултанта);
- е) с акт на компетентен държавен орган .
- ж) или друга причина.

9.2.2. При спиране на изпълнението страните съставят Акт за установяване състоянието на обекта съгласно Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.2.3. Изпълнението може да продължи след отпадане на причините довели до спирането и след съставяне на Акт за установяване състоянието на обекта и необходимите дейности за изпълнението съгласно Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3/2003г. (Изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 11.12.2012 г., в сила от 11.12.2012 г.)

9.3. Срокът за изпълнение на договора автоматично се удължава със срока на спиране на договора.

9.4. За времето на удължаване на срока за изпълнение на договора, Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата до която се удължава действието на договора.

## **10. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. С изтичане на срока по т.3.1., освен ако срокът не е удължен съгласно договореното в чл. 9.3. от настоящия договор.

10.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

10.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

10.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

10.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

10.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

10.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

10.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица

само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

10.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

10.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

10.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## **11. ПОДСЪДНОСТ**

11.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

## **12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 456,35 лв. - 5% от сметната стойност (цената) на договора по т.2.1.

12.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

12.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

12.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

12.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право на самостоятелно основание да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

12.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

12.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

12.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

12.9. В случаите на Раздел „9.” – ти от настоящия договор, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

## **13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

13.1. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на Възложителя в 3-дневен срок от сключването му/им. Задължителни реквизити на договора за подизпълнение са: Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите и описание на дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

13.2. В случаите на замяна на посочен в офертата подизпълнител или включване на нов, в срок до 3 дни Изпълнителят представя копие на договора с новия подизпълнител на Възложителя заедно с доказателства (документи), че са изпълнени условията по чл.66, ал.2, ал.14 и ал. 15 от ЗОП.

13.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.5. Разплащането по т.13.4 се осъществява въз основа на „искане за плащане“, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

13.6. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.13.4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

13.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

13.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява;

13.11. При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 на ЗОП.

#### **14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ**

14.1. „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.


Личните данни, обработвани във връзка с участието в обществени поръчки и изпълнение на договори, се събират на законово основание съгласно Закона за обществените поръчки. Правилника по прилагането му, Закона за ДАНС, Правилника по прилагането му, Закона за счетоводството и др. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите изисквания.

14.2. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 58 от ЗОП, както и на основание чл.53 и чл.54 от ЗМИП.

14.3. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

14.4. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

14.5. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.





14.6. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

14.7. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

## **15. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

15.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

15.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

15.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

15.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд по местоседалището на Възложителя - „Мини Марица - Изток“ ЕАД съгласно клаузата за подсъдност.

15.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

15.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Ценово предложение - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев  
Ръководител отдел „Търговия“

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Инвестиции“

Каюлян Кръстев  
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:  
Виолета Тотева  
Експерт търговия, отдел „Търговия“

**ТЕЛ:**

**НАТАЛИЯ**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ  
„РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕХ „МЕХАНИЧНА РАБОТИЛНИЦА“  
(строителство-СМР)**

**1. Пълно описание на предмета на поръчката (или на позицията)**

*СМР: Ремонт на санитарни помещения (мъжка баня и тоалетна, женска баня и тоалетна) в цех „Механична работилница“*

**Място на изпълнение: Рудник Трояново 1**

**2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка - Приложение №1.1**

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1.1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващия инвеститорски контрол на обекта и представляващ Възложителя – инж.Мария Йорданова .

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1.1 Точните и окончателни за заплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

**3. Категория на строежа: Изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство“ ( 42.21, 43.21,43.22,43.31,43.33,43.34 – КИД 2008г.).**

**4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горещитираните проекти**

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

При изпълнение на горните проекти да се имат предвид следните забележки:

**5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.**

Всички документи в процеса на строителство се изготвят, съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

**6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към**

продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

**7. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:**  
При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени;
- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.
- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена, преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.
- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството, Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложили количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани, като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:
  - ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;
  - ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, консултант и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;
  - ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;



- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.
- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.
- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.
- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.
- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектите или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като: нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.
- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр.15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяваща несъществения отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.
- В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“, навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се посочи еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

• **Фактура**

8. **Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите**
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
  - Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
  - Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
  - Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  - Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;
  - Наредба № 81213-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;
  - Наредба №.РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влагане на строителните продукти в строежите на Република България



- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

#### 9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - 5 години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали и ел.уреди – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

#### 10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е 6 месеца, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ (Приложение №2 и № 3 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр. 15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя линеен график в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя, действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина, като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

#### ИЗГОТВИЛ:

Анна Мащикова

инж. Оценяване и остойностяване на обекти

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

#### СЪГЛАСУВАЛИ:

Живко Желев

Р-л звено „Инв. контрол“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Леонид Ганозлиев

Ръководител отдел „Инвестиции“

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С  
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

От: „ТИЕНГРУП МЕТАЛ“ ЕООД“  
(наименование на участника)  
ЕИК/БУЛСТАТ: 204969130, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора,  
бул.„Метрополит Методи Кусев“38

тел.: 042 92 44 94, факс: ....., e-mail: office@tngroup.eu

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
„Ремонт на санитарни помещения в цех „Механична работилница“ – реф. № 53/2019 –  
ОПнс.

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас  
обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без  
възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на  
възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие  
с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

**Предложените от нас условия са както следва:**

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението  
на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно работния проект, техническата  
спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и  
проектантски норми. При изпълнение на СМР се задължаваме да спазваме всички  
инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи посочени в т.8 от  
техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани  
за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на  
площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до 5.8 /пет цяло и осем/ месеца. Датата, от която ще започне  
да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол  
за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно  
чл.157(1) от ЗУТ( Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове  
и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита  
датата на съставяне на Констативен акт обр.15. С офертата си представяме линеен график за  
изпълнение на работите – Приложение № 1.

**Гаранционни срокове и условия:**

Гаранционният срок на изпълнените работи видове работи е 5 години, след въвеждане в  
експлоатация, в съответствие с минималните гаранционни срокове определени в чл. 20, ал. 4,  
т.4 от Наредба №2 към ЗУТ.

  
ЕООД

Гаранционния срок на доставените от нас материали съответства на гаранционния срок , предлаган от производителя, удостоверен с подходящ документ при доставка (например гаранционна карта).

Всички гаранционни срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

#### Приложения:

Приложение №1 - Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец

Приложение №2 – Линеен график за изпълнение на работите – по образец;

Приложение №3 – Декларация за извършен оглед – по образец

Дата: 15.10.2019г

Подпис: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Наталия Копеева  
(име и фамилия)


# Строителна програма с график за изпълнение на работите /в т.ч. график за доставка на материалите, доставка на Изпълнителя/

за обект:

Ремонт на санитарни помещения (мъжка баня и тоалетна, женска баня и тоалетна) в цех Механична работилница

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ	I месец				II месец				III месец				IV месец				V месец				VI месец			
		1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.	1 септ.	2 септ.	3 септ.	4 септ.
1	I. УПС и Бомб Двигатели - жили	132	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	I. Водосток	50																							
3	I. ЕЛ	16																							
4	II. Баня и тоалетна	192	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	II. Водосток	42																							
6	II. ЕЛ	14																							
7	II. УНИВЕРСАЛНА	32																							
8	III. УПС съставка и жили	120																							
9	III. Водосток	33																							
КОНТРОЛНИ ПРОВЕРКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ																									
ПРИЕМАТЕЛНА ТЕХНИЧЕСКА																									
ПОДГОТОВИТЕЛЕН ПЕРИОД																									
ОБЩО ЗА ОБЕКТА		670	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Диаграма на работната ръка



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


ИЗП:

15 2019г

Наталия Кочев




Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

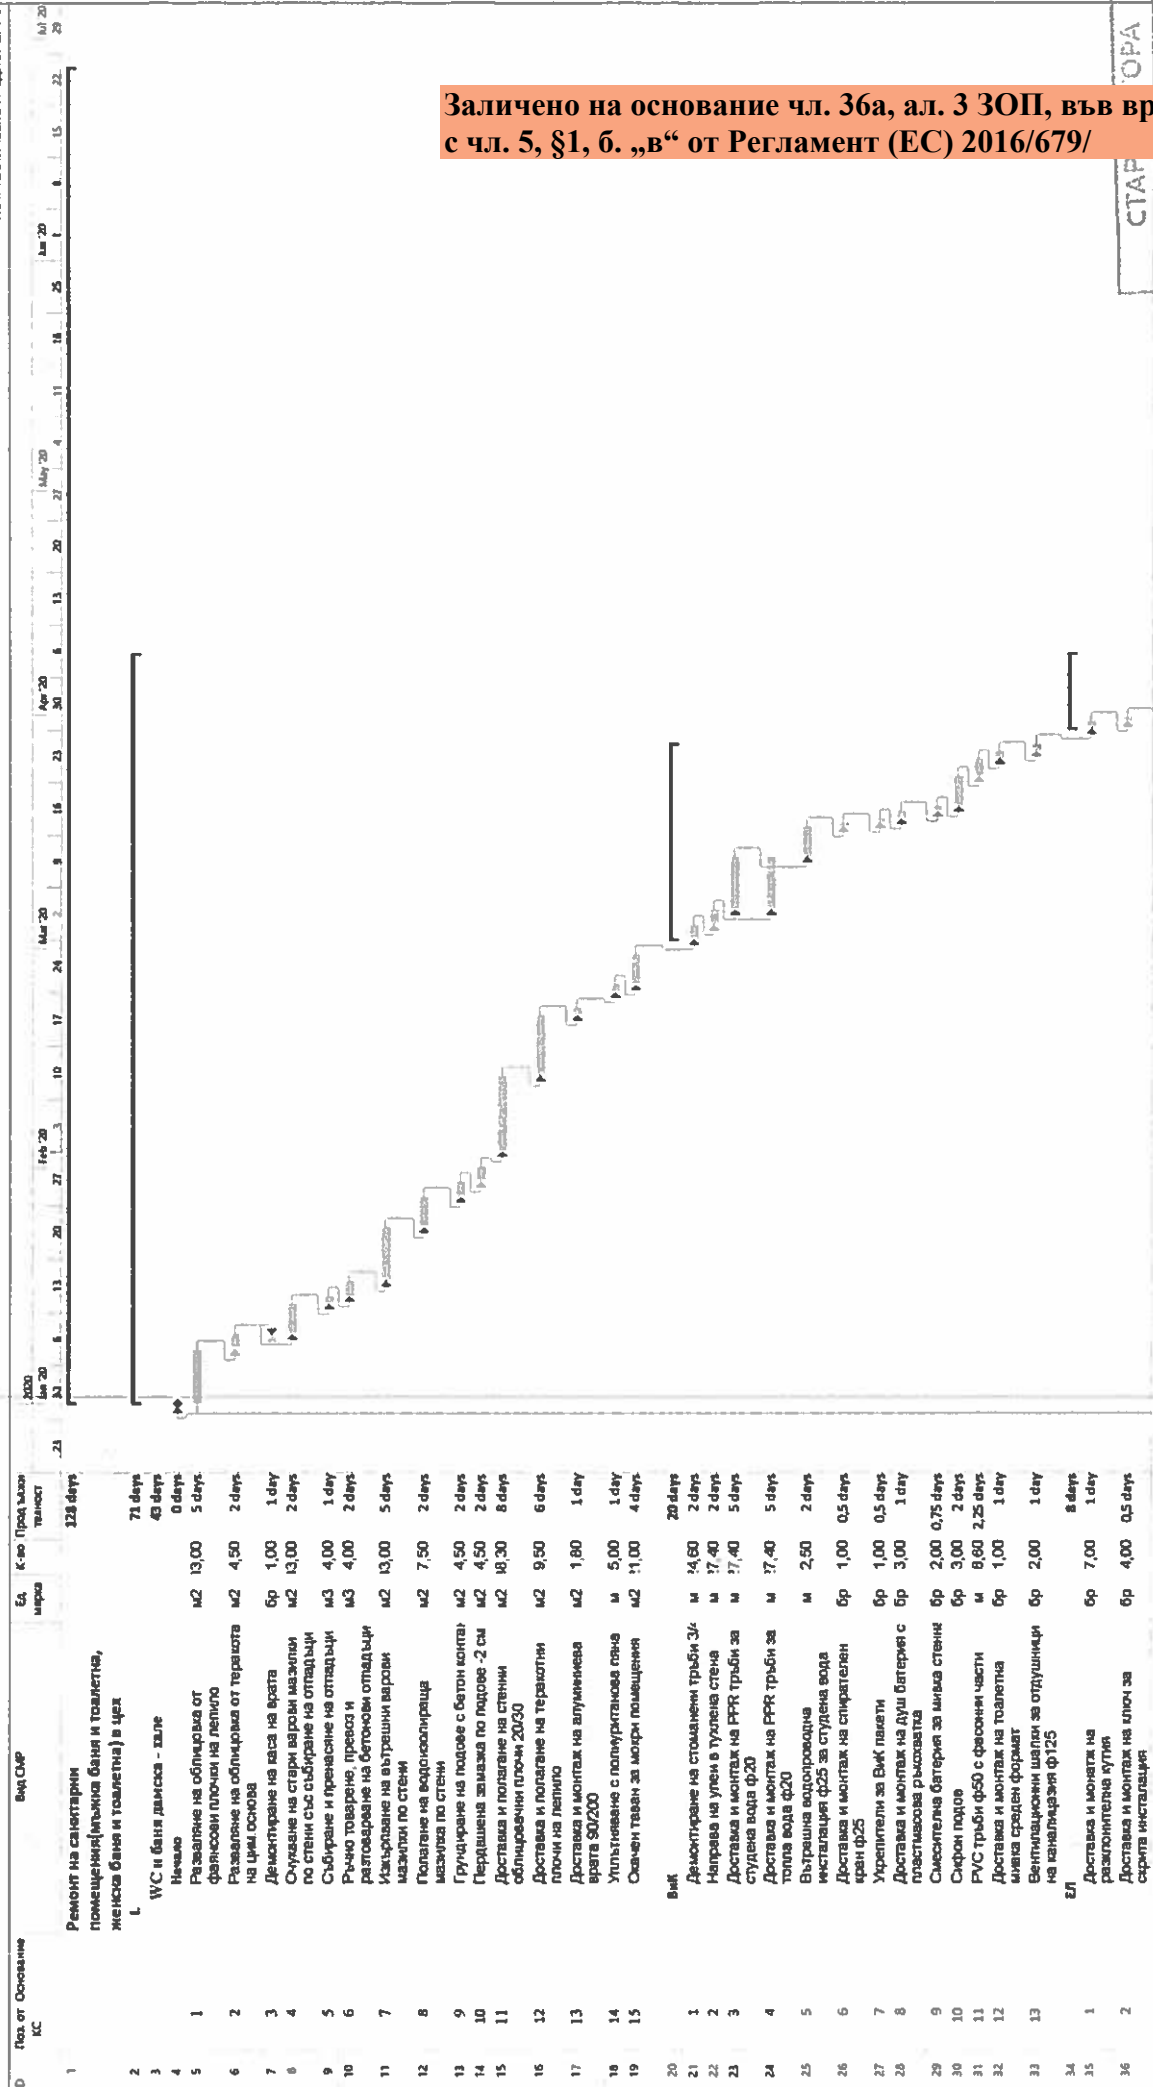

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

СТАП  
ОП  
ОДБМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



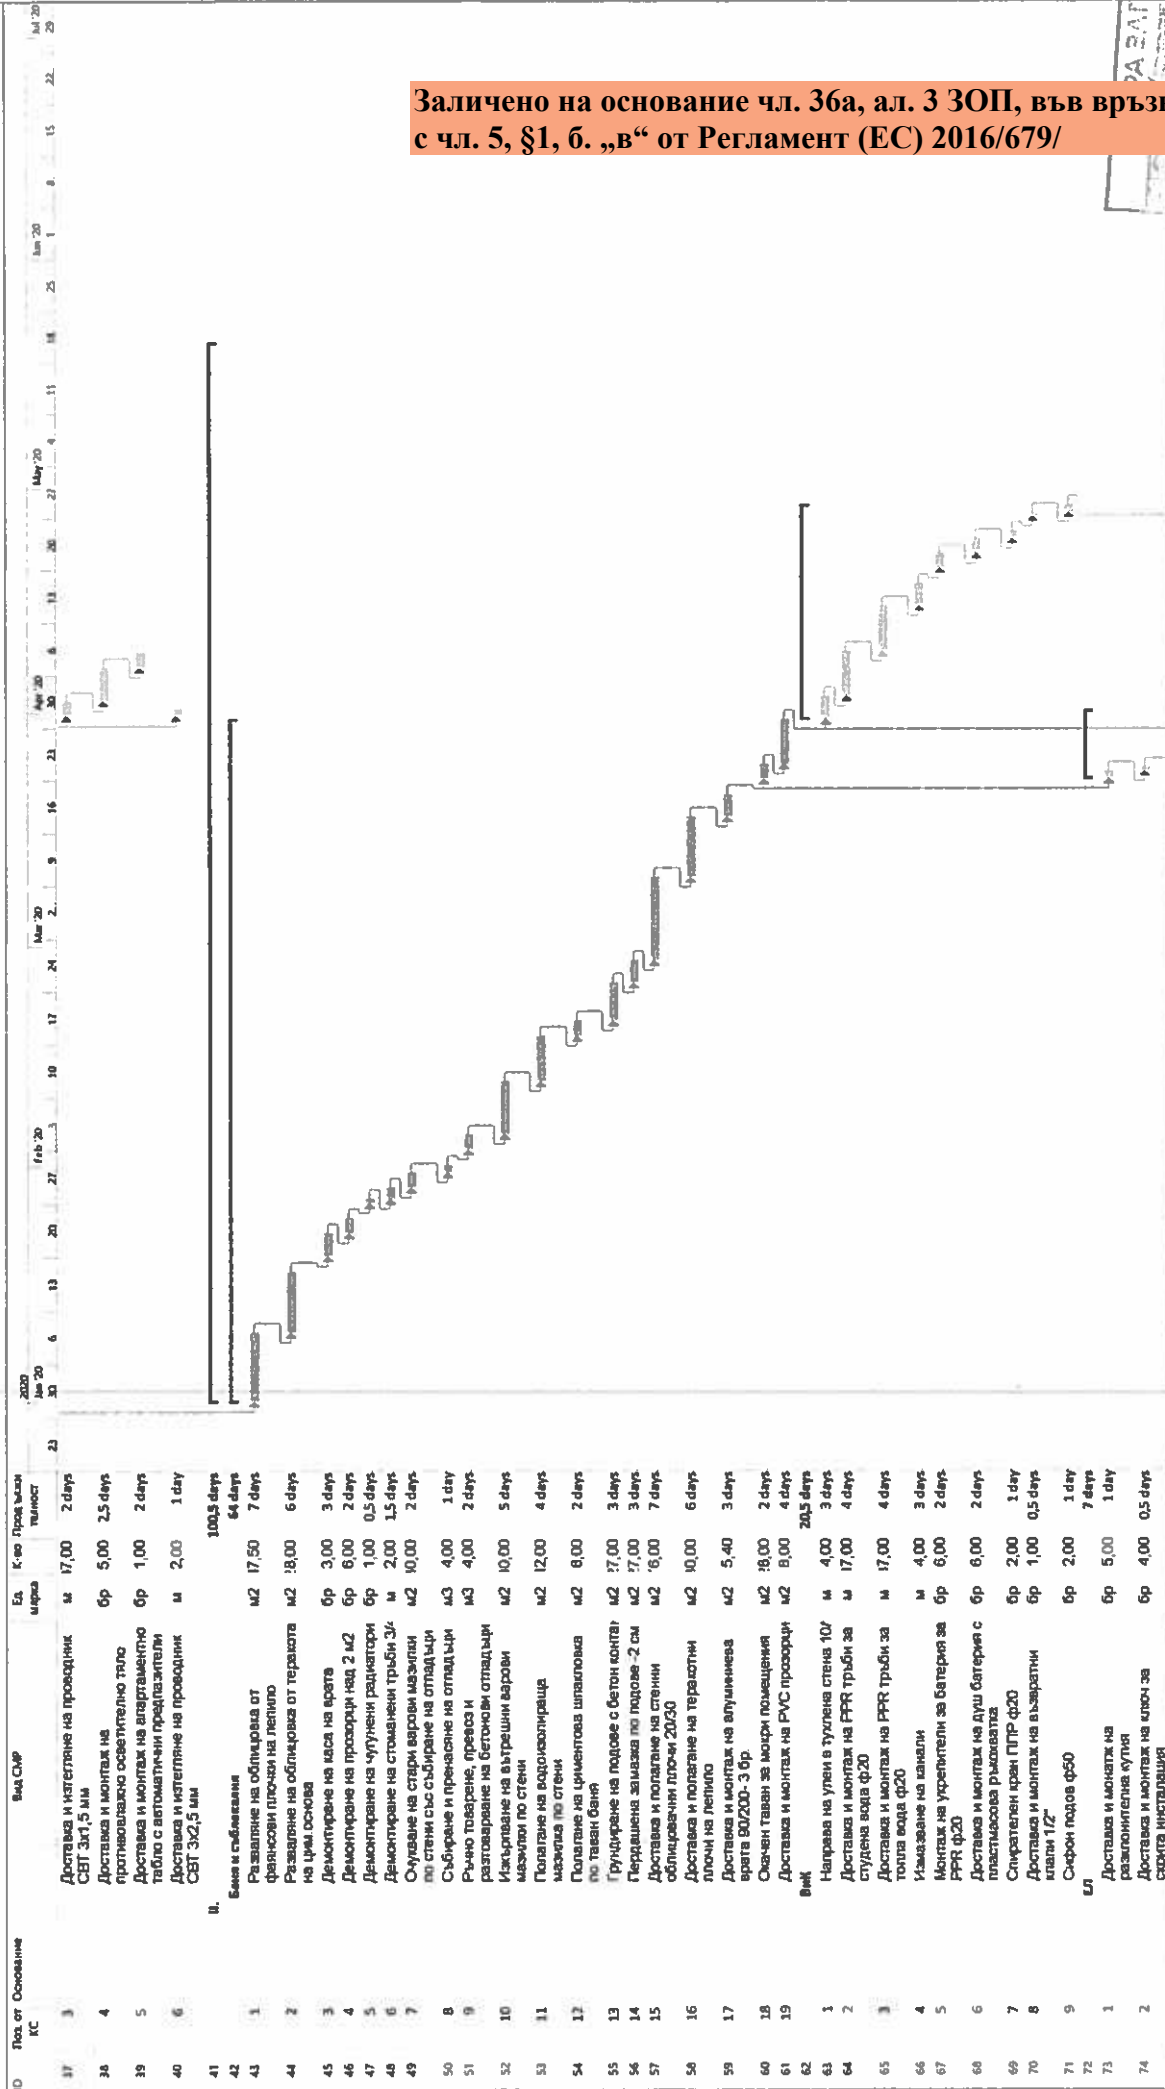

ID	Поз. от КС	Описание	Вид СМР	Ед. мярка	К-во	Продължителност	2020	Jan '20	Feb '20	Mar '20	Apr '20	May '20	Jun '20	Jul '20
75	3	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x1.5 мм	м	18,00	1.5 days									
76	4	Доставка и монтаж на противопоставено осветително тяло	бр	3,00	2 days									
77	5	Доставка и монтаж на вграденото табло с автоматични предпазители	бр	1,00	2 days									
78		УМВАЛНИ												
79	1	Доставка и монтаж на алуминиева врата с термостател 88/210	м2	1,80	0.5 days									
80	2	Доставка и монтаж на алуминиева врата 80/200	м2	1,90	0.5 days									
81	3	Демонтиране на батерия стена	бр	7,00	0.5 days									
82	4	Доставка и полагане на стени облицовъчни плочи 20/20	м2	19,00	4 days									
83	5	Доставка и монтаж на смесителна батерия стена	бр	7,00	2.5 days									
84	6	Скачен таван за мокри помещения PVC хълмър	м2	18,00	4 days									
85	7	Доставка и монтаж на отводнителен канал -монокител 100/9	м	9,00	2 days									
86	8	Доставка и монтаж на противопоставено осветително тяло	бр	3,00	1 day									
87	9	Доставка и монтаж на разклонителен лутия за сграда	бр	3,00	0.5 days									
88	10	Доставка и монтаж на ключ за сградна инсталация	бр	1,00	0.5 days									
89		ПЛ												
90		WC мъже в зал												
91	1	Разваляне на облицовка от фаянсови плочи на лепило	м2	17,50	5.5 days									
92	2	Разваляне на облицовка от теракота на цим. основа	м2	18,00	6 days									
93	3	Демонтиране на каси на врата	бр	3,00	3 days									
94	4	Демонтиране на леми проградни стени	бр	2,00	2 days									
95	5	Очистване на стари варови мазилки по стени със събиране на отпадъци	м2	4,40	2 days									
96	6	Събиране и пренасяне на отпадъци	м3	3,00	1 day									
97	7	Ръчно товарене, превоз и разтоварване на вътрешни варови мазилки по стени	м3	3,00	2 days									
98	8	Извършване на вътрешни варови мазилки по стени	м2	4,40	8 days									
99	9	Грундиране на подове с бетон контакт	м2	1,00	3 days									
100	10	Першаена замазка по подове -2 см	м2	1,00	3 days									
101	11	Доставка и полагане на стени облицовъчни плочи 20/20	м2	18,00	6 days									
102	12	Доставка и полагане на теракотни плочи на лепило	м2	4,00	4 days									
103	13	Осичен таван за мокри помещения	м2	4,00	4 days									
104	14	Монтаж на 2бр. Преградни стени в WC - 2,071.5м	м2	6,00	2 days									
105	15	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200- 2 броя	м2	2,80	1 day									
106		Вид												
107	1	Напрана на улей в турелна стена 10г	м	14,00	11 days									
108	2	Демонтаж на 2бр. порцеланови клека	бр	3,00	0.5 days									
109	3	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода ф20	м	14,00	2 days									
110	4	Измазване на канали	м	14,00	2 days									
111	5	Смартелен кран ПТР ф20	бр	2,00	1 day									

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ТИЕН ГРУП МЕТАЛ БООД		ОБЕКТ: Ремонт на санитарни помещения/извеждане на баня и тоалетна, женска баня и тоалетна в цех Механика работилница		КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ		ПРИЛОЖЕНИЕ №1	
ID	Пост. от Основание КС	Вид СМР	Ед. измер.	К-во	Продължителност	2020	2021
			м²		дни	Jan '20	Jan '21
112	6	Схрон подов ф50	бр	2,00	1 day	23	
113	7	Доставка и монтаж на порцеланова мива среден формат	бр	1,00	0,5 days		
114	8	Доставка и монтаж на порцеланово огледало	бр	3,00	1,5 days		
115	9	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр	1,00	0,5 days		
116							
117		Край			0 days		

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

ОБЩО СЪД  
ОБЩО СЪД  
ОБЩО СЪД

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ТИЕНГРУП МЕТАЛ“ ЕООД,  
(наименование на участника)

ЕИК: 204969130, Седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.,„Метрополит  
Методи Кусев“38,

тел.: 042 92 44 94., факс: ....., e-mail: office@tngroup.eu

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:  
„Ремонт на санитарни помещения в цех „Механична работилница“ – реф. № 53/2019 –  
ОПнс.

Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при следните цени:

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без  
ДДС възлиза на : 29 127.05лв.

Словом: *двадесет и девет хиляди сто двадесет и седем лева и пет стотинки*

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката.

Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и  
др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат  
допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка,  
представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената  
сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойностяване на  
количествената сметка не сме променяли количества, не сме размествали редове, променяли  
и пропускали позиции. Всички цени са с точност до втория знак след десетичната запетая.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни  
средства, форми на плащане и гаранции.

**Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.**

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

- А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща стойност за изпълнение на  
поръчка в лева без ДДС, включително на електронен носител.
- Б) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
- В) Попълнен списък на машините и ценоразпис на машиносмените, използвани за  
изпълнение на СМР
- Г) Попълнен образец на цени на труда за различните специалности и степени на труд
- Д) Попълнен образец на методика за определяне на цената и условията на изпълнение на  
СМР

Дата: 15.10.2019

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Наталия Колева  
(име и фамилия)



## Ремонт на санитарни помещения(мъжка баня и тоалетна, женска баня и тоалетна) в цех Механична работилница

## количествена сметка

№	шифър	наименование СМР	мярка	кол-во	ед.цена	ст-ст
		I.				
		WC и баня дамска - хале				
1	CEK 09,822	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на легило	м <sup>2</sup>	33,00	10,70	353,10
2	CEK 09,822	Разваляне на облицовка от теракота на цим.основа	м <sup>2</sup>	14,50	10,59	153,56
3	CEK 17,801	Демонтиране на каса на врата	бр	1,00	7,78	7,78
4	CEK 10,876	Очукване на стари варови мазилки по стени със събиране на отпадъци	м <sup>2</sup>	33,00	5,32	175,56
5	CEK 05,946/05,947	Събиране и пренасяне на отпадъци	м <sup>3</sup>	4,00	4,50	18,00
6	CEK 01,087	Ръчно товарене, превоз и разтоварване на бетонови отпадъци с колички	м <sup>3</sup>	4,00	19,79	79,16
7	CEK 10,822	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по стени	м <sup>2</sup>	33,00	19,83	654,39
8	CEK 11,273	Полагане на водоизолираща мазилка по стени	м <sup>2</sup>	17,50	4,89	85,58
9	CEK 04,983	Грундиране на подове с бетон контакт	м <sup>2</sup>	14,50	1,87	27,12
10	CEK 11,222	Пердашена замазка по подове -2 см	м <sup>2</sup>	14,50	6,26	90,77
11	CEK 09,003	Доставка и полагане на стенни облицовачни плочи 20/30	м <sup>2</sup>	38,30	30,65	1 173,90
12	CEK 11,074	Доставка и полагане на теракотни плочи на легило	м <sup>2</sup>	19,50	25,99	506,81
13	анализ 1	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/200	м <sup>2</sup>	1,80	145,00	261,00
14	CEK 17,244	Уплътняване с полиуританова пяна	м	5,00	2,74	13,70
15	CEK 20,201	Окачен таван за мокри помещения	м <sup>2</sup>	21,00	30,00	630,00
		Вик				
1	CEK 22,813	Демонтиране на стоманени тръби 3/4"	м	24,60	3,00	73,80
2	CEK 05,837	Направа на улеи в тухлена стена	м	27,40	1,10	30,14
3	CEK 22,082	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода ф20	м	27,40	7,20	197,28
4	CEK 22,082	Доставка и монтаж на PPR тръби за топла вода ф20	м	27,40	7,20	197,28
5	CEK 22,932	Вътрешна водопроводна инсталация ф25 за студена вода	м	12,50	8,10	101,25
6	Анализ 2	Доставка и монтаж на спирателен кран ф25	бр	1,00	11,20	11,20

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/


СТАРА ЗАГОНА  
00Д

№	шифър	наименование СМР	мярка	кол-во	ед. цена	сг-ст
7	СЕК 22,616	Укрепители за ВМК пакети	бр	1,00	25,09	25,09
8	СЕК 22,584,2	Доставка и монтаж на душ батерия с пластмасова ръкохватка	бр	3,00	95,00	285,00
9	СЕК 22,581	Смесителна батерия за мивка стенна	бр	2,00	70,00	140,00
10	Анализ 3	Сифон подов	бр	3,00	12,00	36,00
11	СЕК 22,661,1	PVC тръби ф50 с фасонни части	м	8,60	10,20	87,72
12	СЕК 22,712	Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат	бр	1,00	70,00	70,00
13	СЕК 22,705	Вентилационни шапки за отдушници на канализация ф125	бр	2,00	45,50	91,00
		ЕЛ				
1	СЕК 34,351	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр	7,00	3,50	24,50
2	СЕК 34,391 пр.	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация	бр	4,00	5,50	22,00
3	СЕК 34,227 пр.	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x1,5 мм	м	37,00	2,80	103,60
4	СЕК 34,403 пр.	Доставка и монтаж на противоплажно осветително тяло	бр	5,00	14,00	70,00
5	СЕК 34,518 пр.	Доставка и монтаж на апартаментно табло с автоматични предпазители	бр	1,00	65,00	65,00
6	СЕК 34,231 пр.	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x2,5 мм	м	12,00	3,80	45,60
		I.				5 906,89
		II.				
		Баня и съблекалня				
1	СЕК 09,822	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило	м <sup>2</sup>	47,50	10,70	508,25
2	СЕК 09,822	Разваляне на облицовка от теракота на цим.основа	м <sup>2</sup>	28,00	10,59	296,52
3	СЕК 17,801	Демонтиране на каса на врата	бр	3,00	7,78	23,34
4	СЕК 17,815	Демонтиране на прозорци над 2 м <sup>2</sup>	бр	6,00	11,50	69,00
5	СЕК 18,902	Демонтиране на чугунени радиатори	бр	1,00	7,50	7,50
6	СЕК 22,813	Демонтиране на стоманени тръби 3/4"	м	12,00	3,50	42,00
7	СЕК 10,876	Очукване на стари варови мазилки по стени със събиране на отпадъци	м <sup>2</sup>	30,00	5,32	159,60
8	СЕК 05,946/05,947	Събиране и пренасяне на отпадъци	м <sup>3</sup>	4,00	4,50	18,00
9	СЕК 01,087	Ръчно товарене, превоз и разтоварване на бетонови отпадъци с колички	м <sup>3</sup>	4,00	19,79	79,16
10	СЕК 10,822	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по стени	м <sup>2</sup>	30,00	19,83	594,90
11	СЕК 11,273	Полагане на водоизолираща мазилка по стени	м <sup>2</sup>	42,00	4,89	205,38
12	СЕК 10,827	Полагане на циментова шпакловка по таван баня	м <sup>2</sup>	18,00	11,66	209,88
13	СЕК 04,983	Грундиране на подове с бетон контакт	м <sup>2</sup>	27,00	1,87	50,49

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

№	шифър	наименование СМР	мярка	кол-во	ед.цена	ст-ст
14	СЕК 11,222	Пердашена замазка по подове -2 см	м <sup>2</sup>	27,00	6,26	169,02
15	СЕК 09,003	Доставка и полагане на стенни облицовачни плочи 20/30	м <sup>2</sup>	76,00	30,65	2 329,40
16	СЕК 11,074	Доставка и полагане на теракотни плочи на лепило	м <sup>2</sup>	30,00	25,99	779,70
17	анализ 1	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/200- 3 бр.	м <sup>2</sup>	5,40	145,00	783,00
18	СЕК 20,201	Окачен таван за мокри помещения	м <sup>2</sup>	28,00	30,00	840,00
19	анализ 1	Доставка и монтаж на PVC прозорци	м <sup>2</sup>	8,00	145,00	1 160,00
		<b>Вик</b>				0,00
1	СЕК 05,837	Направа на улеи в тухлена стена 10/10	м	14,00	1,10	15,40
2	СЕК 22,082	Доставка и монтаж на PPR тръби за студена вода ф20	м	37,00	7,20	266,40
3	СЕК 22,082	Доставка и монтаж на PPR тръби за топла вода ф20	м	37,00	7,20	266,40
4	Анализ 4	Измазване на канали	м	14,00	4,20	58,80
5	СЕК 22,616	Монтаж на укрепители за батерия за PPR ф20	бр	6,00	4,70	28,20
6	СЕК 22,584,2	Доставка и монтаж на душ батерия с пластмасова ръкохватка	бр	6,00	95,00	570,00
7	Анализ 6	Спирателен кран ППР ф20	бр	2,00	11,20	22,40
8	СЕК 22,601	Доставка и монтаж на възвратни клапи 1/2"	бр	1,00	12,00	12,00
9	Анализ 3	Сифон подов ф50	бр	2,00	12,00	24,00
		<b>ЕЛ</b>				0,00
1	СЕК 34,351	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр	5,00	3,50	17,50
2	СЕК 34,391 пр.	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация	бр	4,00	5,50	22,00
3	СЕК 34,227 пр.	Доставка и изтегляне на проводник СВТ 3x1,5 мм	м	28,00	2,80	78,40
4	СЕК 34,403 пр.	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр	3,00	14,00	42,00
5	СЕК 34,518 пр.	Доставка и монтаж на апартаментно табло с автоматични предпазители	бр	1,00	65,00	65,00
		<b>УМИВАЛНЯ</b>				0,00
1	анализ 1	Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел 88/210	м <sup>2</sup>	1,80	145,00	261,00
2	анализ 1	Доставка и монтаж на алуминиева врата 90/200	м <sup>2</sup>	1,90	145,00	275,50
3	СЕК 22,842	Демонтиране на батерия стенна	бр	7,00	6,50	45,50
4	СЕК 09,003	Доставка и полагане на стенни облицовачни плочи 20/30	м <sup>2</sup>	39,00	30,65	1 195,35
5	СЕК 22,581	Доставка и монтаж на смесителна батерия стена	бр	7,00	70,00	490,00
6	СЕК 20,201	Окачен таван за мокри помещения PVC хънтър	м <sup>2</sup>	26,00	30,00	780,00
7	анализ 7	Доставка и монтаж на отводнителен канал -монолитен 100/9	м	9,00	38,00	342,00
8	СЕК 34,403 пр.	Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло	бр	3,00	14,00	42,00

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



№	шифър	наименование СМР	мярка	кол-во	ед.цена	ст-ст
9	СЕК 34,351	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация	бр	3,00	3,50	10,50
10	СЕК 34,391 пр.	Доставка и монтаж на ключ за скрита инсталация	бр	1,00	2,50	2,50
11		II.				13 257,99
		III.				
		WC мъжка в хале				
1	СЕК 09,822	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на лепило	м <sup>2</sup>	47,50	10,70	508,25
2	СЕК 09,822	Разваляне на облицовка от теракота на цим.основа	м <sup>2</sup>	28,00	10,59	296,52
3	СЕК 17,801	Демонтиране на каса на врата	бр	3,00	7,78	23,34
4	анализ 8	Демонтиране на леки преградни стени	бр	2,00	9,20	18,40
5	СЕК 10,876	Очукване на стари варови мазилки по стени със събиране на отпадъци	м <sup>2</sup>	14,40	5,32	76,61
6	СЕК 05,946/05,947	Събиране и пренасяне на отпадъци	м <sup>3</sup>	3,00	4,50	13,50
7	СЕК 01,087	Ръчно товарене, превоз и разтоварване на бетонови отпадъци с колички	м <sup>3</sup>	3,00	19,79	59,37
8	СЕК 10,822	Изкърпване на вътрешни варови мазилки по стени	м <sup>2</sup>	14,40	19,83	285,55
9	СЕК 04,983	Грундиране на подове с бетон контакт	м <sup>2</sup>	11,00	1,87	20,57
10	СЕК 11,222	Пердашена замазка по подове -2 см	м <sup>2</sup>	11,00	6,26	68,86
11	СЕК 09,003	Доставка и полагане на стенни облицовачни плочи 20/30	м <sup>2</sup>	56,00	30,65	1 716,40
12	СЕК 11,074	Доставка и полагане на теракотни плочи на лепило	м <sup>2</sup>	14,00	25,99	363,86
13	СЕК 20,201	Окачен таван за мокри помещения	м <sup>2</sup>	14,00	30,00	420,00
14	анализ 1	Монтаж на 2бр. Преградни стени в WC - 2.0/1.5м	м <sup>2</sup>	6,00	42,00	252,00
15	анализ 1	Доставка и монтаж на алуминиева врата 70/200- 2 броя	м <sup>2</sup>	2,80	145,00	406,00
		Вик				
1	СЕК 05,837	Направа на улеи в тухлена стена 10/10	м	24,00	1,10	26,40
2	анализ 5	Демонтаж на 2бр.порцеланови клекала	бр	3,00	12,79	38,37
3	СЕК 22,082	Доставка и монтаж на RPR тръби за студена вода ф20	м	24,00	7,20	172,80
4	Анализ 4	Измазване на канали	м	24,00	4,20	100,80
5	Анализ 6	Спирателен кран ППР ф20	бр	2,00	11,20	22,40
6	Анализ 3	Сифон подов ф50	бр	2,00	12,00	24,00
7	СЕК 22,712	Доставка и монтаж на порцеланова мивка среден формат	бр	1,00	68,84	68,84
8	СЕК 22,755	Доставка и монтаж на порцеланово клекало	бр	3,00	100,00	300,00
9	СЕК 22,581	Доставка и монтаж на смесителна батерия за мивка	бр	1,00	70,00	70,00

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/


СЧЕТНА СЪПРАВКА

ЛОСД



№	шифър	наименование СМР	мярка	кол-во	ед. цена	ст-ст
		III.				5 352,84
		ОБЩА СТОЙНОСТ НА СМР :				24 517,72
		ПЕЧАЛБА 8 %				1 961,42
		непредвидени 10%				2 647,91
		СМЕТНА СТОЙНОСТ				29 127,05

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



15.10.2019  
Наталья Кондрат  
управител

Ремонт на санитарни помещения(мъжка баня и тоалетна, женска баня и тоалетна) в цех Механична работилница


**Списък**  
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените  
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация /специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	Доп. разходи, %	Стойност, лв
1	ТОВАРЕН КАМИОН	1,5	250	15	431,25
2	ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	0,8	8	15	7,36
3	РЪЧНА ЕЛ.ТЕХНИКА	15,5	10	15	178,25
4	МАШИНА ЗА РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИ	12	5	15	69

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. 3, в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Ремонт на санитарни помещения(мъжка баня и тоалетна, женска баня и тоалетна) в цех Механична работилница

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна цена, лв.	доп. разходи, %	Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
1	ВАРОВ РАЗТВОР	м3	2	5,5	8	11,88	Варовцентър
2	ЦИМЕНТ СИВ -ТОРБИ	кг	21	0,18	8	4,08	Вулкан
3	ВОДОИЗОЛИРАЩА МАЗИЛКА	кг	120	1,2	8	155,52	Теразид
4	ГРУНД ЗА БЕТОН-БЕТОНКОНТАКТ	л	10,5	2,14	8	24,2676	Теразид
5	циментена замазка за подовеи таван	кг	550	0,2	8	118,80	Вебер
6	СТЕННИ ОБЛИЦОВАЩИ ПЛОЧКИ	м2	209,3	18	8	4068,79	Каи Груп
7	ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ	м2	63	18	8	1224,72	Каи Груп
8	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИКА	кг	365	0,5	8	197,10	Вебер
9	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	90	4	8	388,80	Вебер
10	АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ И прозорци	м2	20	140	8	3024,00	ЕТ Виктор Данчев
11	ВИНТОВЕ	кг	2	2	8	4,32	ИТТ
12	КЛИНОВЕ ДЪРВЕНИ	м3	0,005	200	8	1,08	Хоме макс
13	ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА	л	2	8	8	17,28	Хоме макс
14	ПАНО ТАВАННО 600/600	бр	250	11	8	2970	Декор трейд
15	НОСАЧ ГЛАВЕН	м	75	1,38	8	111,78	Декор трейд
16	НОСАЧ НАПРЕЧЕН	м	150	1,5	8	243	Декор трейд
17	НОСАЧ НАПРЕЧЕН КЪС	м	75	1,1	8	89,1	Декор трейд
18	ОКАЧВАЧ	м	63	0,35	8	23,814	Декор трейд
19	ПРОФИЛ ОКРАЙЧВАЩ	м	60	0,63	8	40,824	Декор трейд
20	СПИРАТЕЛЕН КРАН ф25	бр	1	10	8	10,8	Санитас
21	СПИРАТЕЛЕН КРАН ф20	бр	4	6,5	8	28,08	Санитас
22	ДУШ БАТ. С ПЛАСТМ. РЪКОХВАТКА	бр	9	70	8	680,4	Интер Керамик
23	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА СТ.	бр	10	50	8	540	Интер Керамик

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

24	СИФОН ПОДОВ	бр	7	10	8	75,6	Акво
25	РВС ТРЪБИ Ф50 с с ФАСОННИ ЧАСТИ	м	9	5,2	8	50,544	Пипе Индустриал
26	PPR ТРЪБИ Ф25	м	12,5	2,2	8	29,7	Аквасто
27	PPR ТРЪБИ ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф20	м	88,5	1,4	8	133,812	Аквасто
28	PPR ТРЪБИ ЗА ТОПЛА ВОДА Ф20	м	65	1,4	8	98,28	Аквасто
29	ПОАЛЕТНИ МИВКИ СРЕДЕН ФОРМАТ	бр	2	50	8	108	ИнтерКерамик
30	Вентил. шапки за отдуш. на канал- ф125	бр	2	30	8	64,8	Деплан
31	ПОРЦЕЛАНОВО КЛЕКАЛО	бр	1	40	8	43,2	Интер Керамик
32	ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ	бр	1	8	8	8,64	Сферако
32	УКРЕПИТЕЛИ ЗА БАТЕРИЯ за PPR Ф20	бр	7	6	8	45,36	Аквасто
33	ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ	м	9	22	8	213,84	Деворекс
34	РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ	бр	15	2	8	32,4	Електро пласт
35	КЛЮЧ СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ	бр	9	3	8	29,16	Шнайдер Електрик
36	ПРОВОДНИК СВТ 3х1.5	м	65	1,1	8	77,22	Гама кабел
37	ПРОВОДНИК СВТ 3х2.5	м	12	1,6	8	20,736	Гама кабел
38	ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр	13	10	8	140,4	Елмарк
39	АПАРТАМЕНТНО ТАБЛО - с АВТ. ПРЕДП.	бр	2	60	8	129,6	Вико

Забележка: Потълава се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Натс

СТАРА ЗАГОРА

ЕООД

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

## ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:  
**Ремонт на санитарни помещения(мъжка баня и тоалетна, женска баня и тоалетна) в цех**  
**Механична работилница**

№	Наименование	I ст. ч.ч.	I ст. разц.	II ст. ч.ч.	II ст. разц.	III ст. ч.ч.	III ст. разц.	коэф.
1	Работник мазилки	846	3,6	237	3,9	x	x	0,2
2	Работник облицовки	1328	3,6	756	3,9	x	x	0,38
3	Работник настилки	579	3,6	286	3,9	x	x	0,16
4	Работник ел.инсталации	170	3,6	77	3,9	x	x	0,05
5	Работник монтажник ВИК	392	3,6	224	3,9	x	x	0,11
5	Работник сухо строителство	179	3,6	358	3,9	x	x	0,1

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.1

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

СТАДЕНГОРА  
ЕООД  
Наталия Кондрова

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/



## МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА

за изпълнение на СМР на обект:

Ремонт на санитарни помещения(мъжка баня и тоалетна, женска баня и тоалетна) в цех  
Механична работилница

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : 65 %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: 15 %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: 8 %

2.4. Печалба: 8 %

2.5. ....

2.6. ....

3. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

4. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

**Забележка:** Попълва се от участниците в конкурса.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка  
с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Наталия Колева
